



OSMANIYE İLİ KAMU YATIRIMLARI

EKİM 2017



T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ



KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kadirli-Andırın 2+000-41+183
Proje No	1986E040380
Sektörü ve Alt Sektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (ilçe)	Kadirli
Başlama - Bitiş Tarihi	09.02.2017-05.05.2018
Proje Bedeli (TL)	24.000.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	-
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	3.200.000
2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	160
Fiziki Gerçekleşme (%)	13
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 39,2 km uzunluğundaki yolun 19 km'si Osmaniye İl sınırında olup TY-SK standardındadır. 2016 yılı sonu itibariyle 35,4 km'si (önceki ihaleler kapsamında) tamamlanmıştır. Km:16+000-16+100 arasında meydana gelen heyelan için ve kalan 3,8 Km'nin tamamlanması için, İkmal ihalesi yapılmış olup 09.02.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. 2017 yılında heyelan için hazırlanan geoteknik proje doğrultusunda kazık imatları büyük oranda tamamlanmıştır. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kadirli-Sumbas Yolu Km:0+000-9+661 arası
Proje No	1964E042100
Sektörü ve Alt Sektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	Kadirli- Sumbas
Başlama - Bitiş Tarihi	29.05.2012-07.01.2018
Proje Bedeli (TL)	14.500.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	-
2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 9,7 km uzunluğundaki yolun 6 km BY-SK , 3,7 km si TY-SK ' dır. Yolda 29.05.2012 tarihinde işyeri teslimi yapılmış olup kamulaştırma problemleri nedeniyle daha önceki yıllarda çalışma yapılamamıştır. Kamulaştırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmalar devam etmektedir. Projede 1 adet 30 metre tek köprü bulunmaktadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Osmaniye-Nurdağı Yolu (BSK İşi) (Km:15+000-52+126)
Proje No	2010E040160
Sektörü ve Alt Sektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	Osmaniye- Düziçi- Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	31.05.2016-19.09.2019
Proje Bedeli (TL)	60.700.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	3.140.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	4.231.000
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	423
Fiziki Gerçekleşme (%)	13
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 37,1 km uzunluğundaki yolun 29,4 km'si Osmaniye ili sınırlarındadır. Bu ihale kapsamında 27 km BY-BSK ve 10,1 km BSK onarım yapılacaktır. 2016 yılı sonu itibariyle yolun muhtelif kesimlerindeki toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır. 2017 yılında 4.8 Km BY-BSK tek taraflı olarak (Gaziantep ilinde) tamamlanmıştır.

*Danıştay 13 Dairesi tarafından verilen 13.04.2017 tarihli ve E:2015/6486, K:2017/988 sayılı karar sonucu yüklenici firmada değişiklik olacağından, yapımı KLV inşaat A.Ş. taahhüdünde bulunan "Osmaniye-Nurdağı Yolu Km: 15+000-52+126,16 arası Toprak işleri, Sanat yapıları ve BSK'lı Üstyapı İşi" ile ilgili olarak sözleşmenin sonlandırılması amacıyla tasfiye süreci devam etmektedir.




Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Osmaniye-Liman Bağlantısı (Km:0+000-11+615)
Proje No	1964E042100
Sektörü ve Alt Sektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale
Başlama - Bitiş Tarihi	03.09.2015-20.10.2017
Proje Bedeli (TL)	41.600.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	28.230.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	2.000.328
2017 Yılı Ödeneği (TL)	8.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	25
Fiziki Gerçekleşme (%)	77
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 11,6 km uzunluğunda BY standardındaki yolda 03.09.2015 tarihinde yapım çalışmalarına başlanmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle 7,6 km BY-BSK ve 38 metre ve 44 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü (Sukemeri Köprüsü, Otoyol Bağlantı Köprüsü) tamamlanmıştır. 2017 yılında 52 metre uzunluğunda 1 adet çift köprü (Burnaz Köprüsü) tamamlanmıştır.

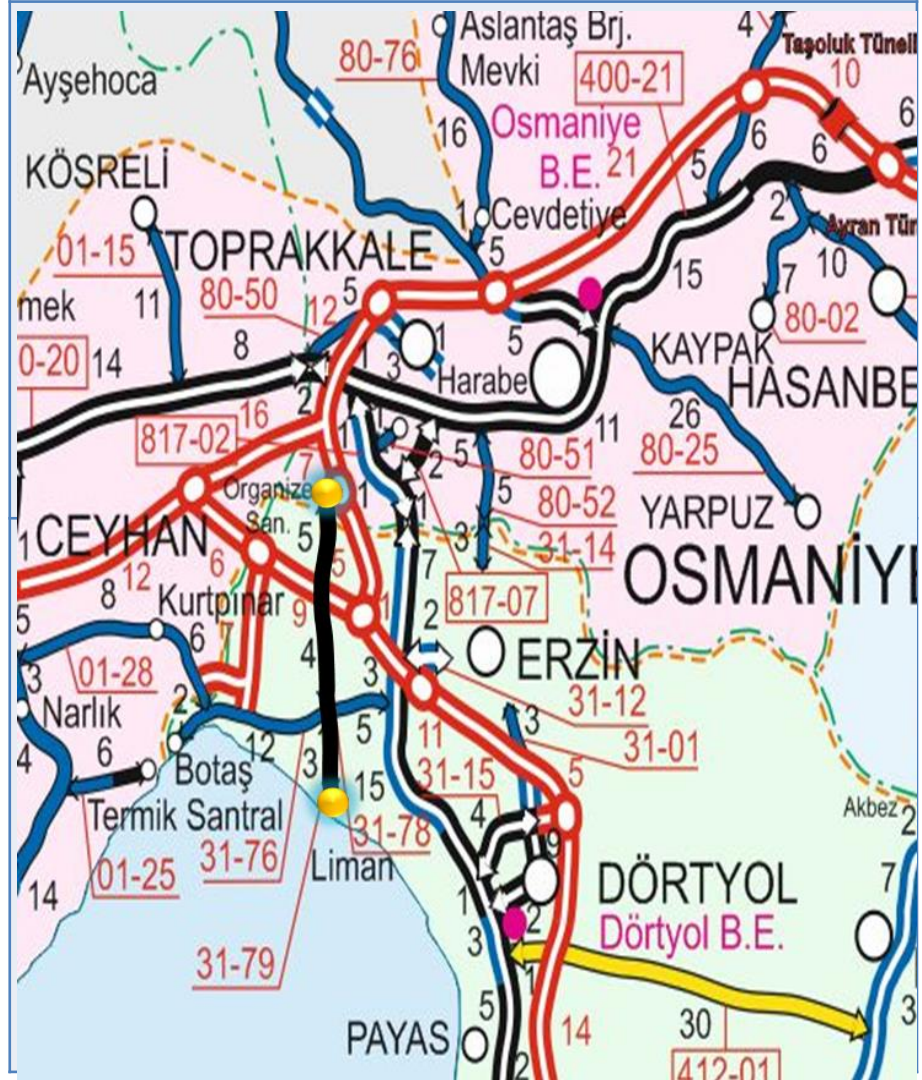

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller


Proje Adı	Ceyhan-Çukurköprü-Kozan Devlet Yolu
Proje No	2013E040720
Sektörü ve Alt Sektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (ilçe)	Kadirli
Başlama - Bitiş Tarihi	14.12.2015-31.12.2019
Proje Bedeli (TL)	116.400.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	4.090.000
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	-
2017 Yılı Ödeneği (TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	4
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 72 km uzunluğunda olan yolun 16 km' si Osmaniye ili sınırlarındadır. İlk projesinde 10 Km BY-62 Km TY iken 06.01.2017 tarihli Ön Değerlendirme Olur'u ile Ceyhan-Çukurköprü arası 36 km 'lik kesimin tamamı BY standardına dönüştürülmüştür. Bu ihale bünyesinde yolun tamamının BSK'lı olarak yapılması ve 4 adet köprü yapılması planlanmaktadır. 14.12.2015 tarihinde çalışmalara başlanmıştır.2016 yılı sonu itibariyle 1 adet (48 m) çift köprü, 1 adet (42 m) tek köprü yapılmıştır.

Kamulaştırma Planı hazırlanmış olup Kamu Yararı Kararı alınmış ve mevcut projesinde BY olan kesimlerde vatandaşlar ile pazarlık görüşmelerine başlanmıştır. Güzergahta TEDAŞ, TEİAŞ, ASKİ ve Telekom'a ait tesislerin deplase edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Çukurköprü- Kadirli arası 16 Km'lik kesimin BY olarak yapılması için KGM'ye Ön değerlendirme Olur 'u yazısı yazılmıştır

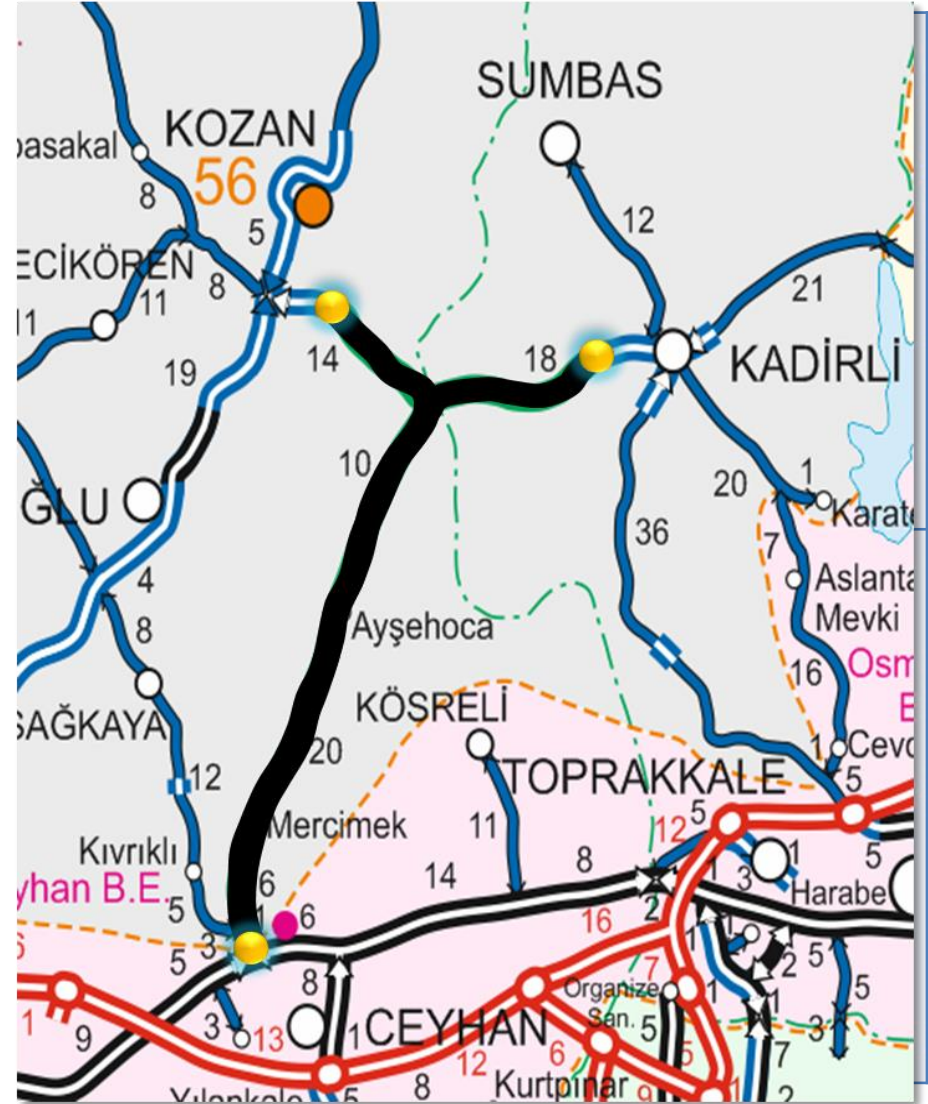


Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	TARSUS-G.ANTEP ve TOPRAKKALE-İSKENDERUN OTOYOLUNDA MUHT. KESİMLERİN ÜSTYAPI ONARIMI YAPIM İŞİ
Proje No	2012E040870
Sektörü ve Alt Sektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale- Osmaniye- Düziçi- Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	06.01.2015-30.11.2017
Proje Bedeli (TL)	37.702.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	7.814.282
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	7.463.401
2017 Yılı Ödeneği (TL)	7.491.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	99
Fiziki Gerçekleşme (%)	28
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toplam 23 km uzunluğunda 2X3 standardındaki yolun (BSK yenileme çalışmaları içinin) 14,1 km'si Osmaniye sınırlarındadır. 2016 yılı sonu itibariyle toplam 8 km (3,6 km Osmaniye ilinde) BSK yenileme işi tamamlanmıştır. 2017 yılında, 4,43 km BSK onarım işi (3,1 km'si Osmaniye ilinde) tamamlanmıştır.

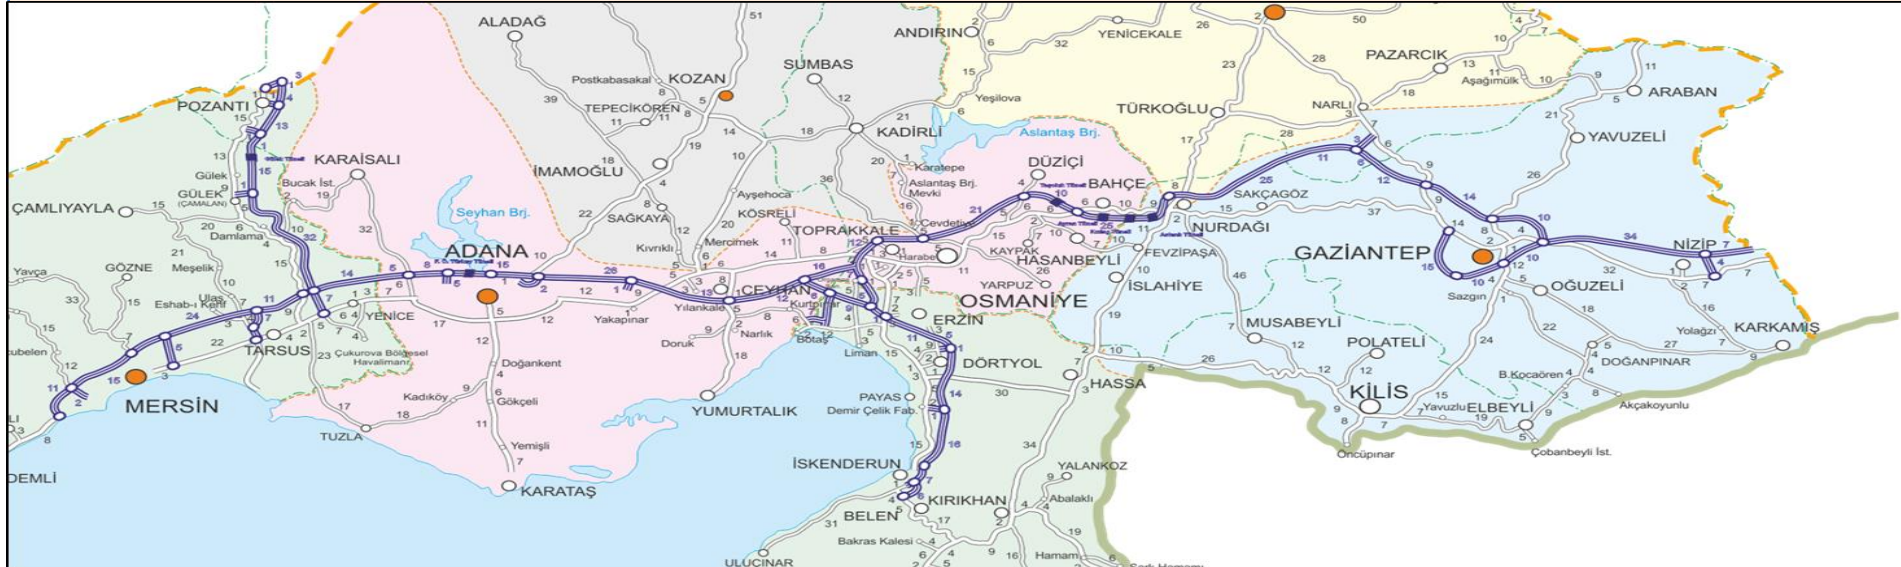


Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Toprakkale-Osmaniye Devlet Yolunun 80-50 K.K no'lu Toprakkale İy.Ayr.-Osmaniye Çevre Yolu arası BY-BSK ONR
Proje No	1993E040860-2017E040150
Sektörü ve Alt Sektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale
Başlama - Bitiş Tarihi	10.08.2017-25.02.2018
Proje Bedeli (TL)	57.500.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	-
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	-
2017 Yılı Ödeneği (TL)	-
Nakdi Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Toprakkale- Osmaniye Çevre Yolu arası toplam 12,7 km uzunluğundaki kesim mevcutta BY-BSK olup bu ihale bünyesinde BSK onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu kesimin 09.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 10.08.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır.

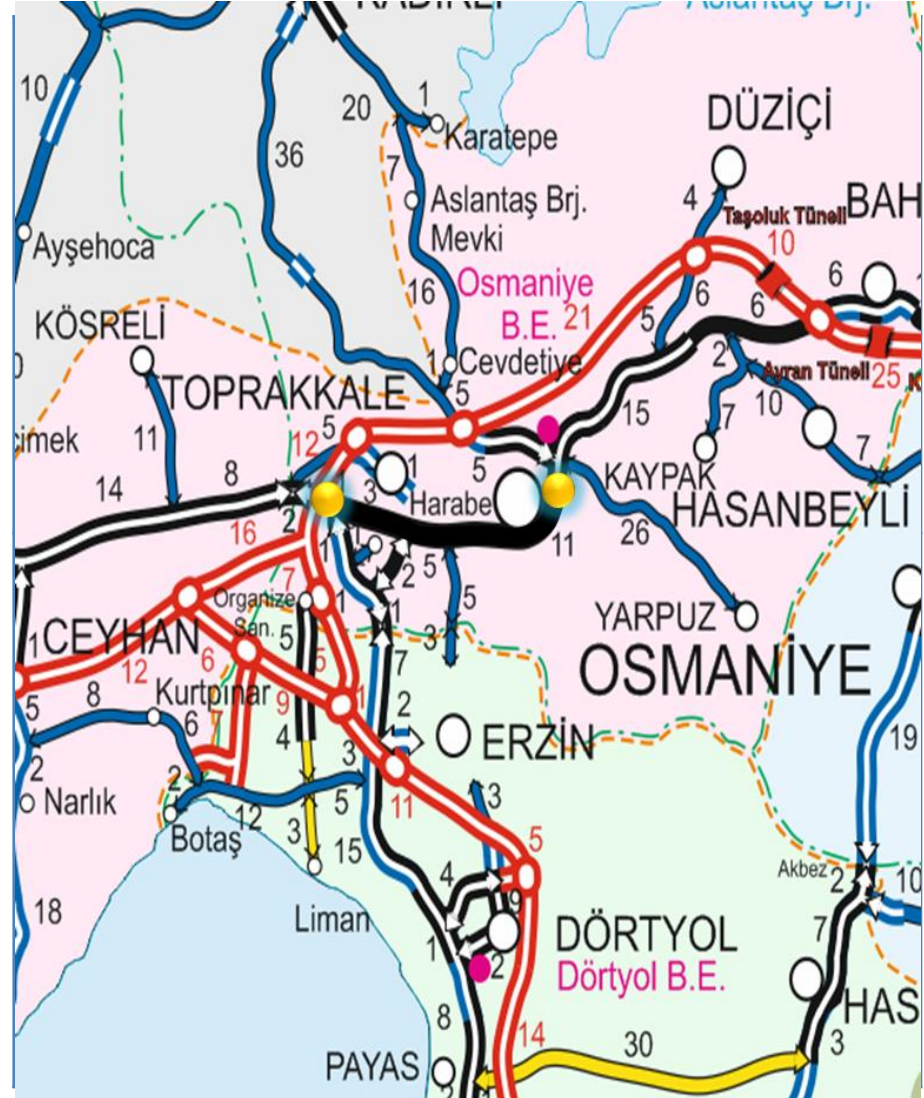


Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	KADIRLI- OSMANİYE YOLU
Proje No	1964E042100
Sektörü ve Alt Sektörü	ULAŞTIRMA
Proje Yeri (İlçe)	Kadirli
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli (TL)	79.500.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	-
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	-
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.300.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-
Projenin Bugünkü Durumu	İhale aşamasında

Proje Özet Bilgisi

Toplam 45.6 Km uzunluğunda olan yolda, ihale kapsamında Kadirli- Sumbas Yolunda 1 Km TY-SK>BSK, Kozan-Kadirli Yolunda 3 KM BY-BSK ONR., Kadirli-Osmaniye Yolunda 36,3 Km TY-SK>BSK, 3,8 Km BY-SK>BSK, 1.5 Km BY-BSK ONR. yapılması planlanmaktadır. 03.08.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.

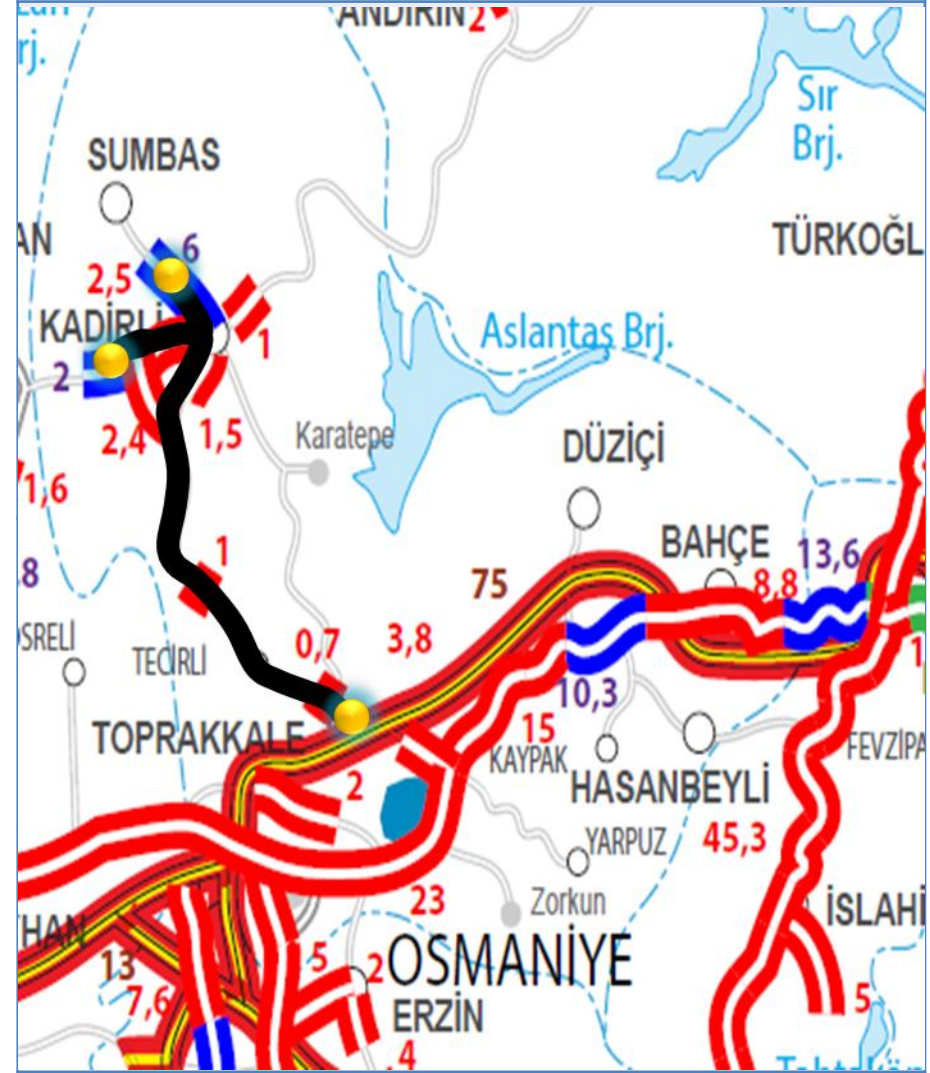



T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ



İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İLLER BANKASI A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü





İLBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Atalan-Ellek-Yarbaşı Kanalizasyon Yapım İnş.
Proje No	-
Sektörü ve Alt Sektörü	DKH-Sosyal-Kanalizasyon
Proje Yeri (İlçe)	Düziçi
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli (TL)	11.773.280,45
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	7.922.137,45
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	3.788.183,40
2017 Yılı Ödeneği (TL)	3.788.183,40
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Tesis tamamlanmıştır.

Proje Özet Bilgisi

Tesis 12.06.2015 tarihinde ihale edilmiş olup, 09.03.2016 tarihinde sözleşmesi, 18.03.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 18.05.2017 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır.





T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ



ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	AĞAÇL. VE TOPRAK MUH.PROJESİ
Proje No	2017A05040
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	2.708.000
İhale Bedeli(TL)	2.708.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	1.548.540
2017 Yılı Ödeneği(TL)	2.708.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	57
Fiziki Gerçekleşme (%)	100
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Bu Projede;

FAALİYET ADI	BİRİMİ	PROGRAM	GERÇEKLEŞME
		Ha	Ha
AĞAÇLANDIRMA	TESİS	250	187
	BAKIM	650	581
REHABİLİTASYON	TESİS	332	280
	BAKIM	400	327
EROZYON KONTROLÜ	TESİS	500	500
	BAKIM	1100	1100
MADEN	TESİS	1	1
	BAKIM	2	2
ETÜD PROJE		800	800



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ORMAN İŞLETMECİLİĞİ PROJESİ
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormanlık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	721.000
İhale Bedeli(TL)	721.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	391.088
2017 Yılı Ödeneği(TL)	721.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	54
Fiziki Gerçekleşme (%)	107
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Bu Projede yıl sonu itibariyle;

FAALİYET ADI	BİRİM	PROGRAM	GERÇEKLEŞME
		Miktar	Miktar
ORMAN YOLLARI			
Planlama	Adet	1	1
Yeni Yol	Km.	15	19
Büyük Onarım	Km.	15	16
Sanat Yapısı	Km.	15	15



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	FİDAN ÜRETİM PROJESİ
Proje No	
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormanlık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	244.000
İhale Bedeli(TL)	244.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	66.000
2017 Yılı Ödeneği(TL)	244.000
2016 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	27
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Projenin Bugünkü Durumu	DE

Proje Özet Bilgisi

Bu Projede yıl sonu itibariyle;

FİDAN-TOHUM	BİRİM	PROGRAM	GERÇEKLEŞME
1-Fidan Üretimi	Adet	1.000.000	1.000.000
2-Fidan Bakımı	Adet	975.000	975.000
3-Tohum Üretimi	Ton	2,0	0,0




Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ORMAN KÖYLERİ ETÜT PLANLAMA PROJESİ
Proje No	2017A05060
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	15.000
İhale Bedeli(TL)	15.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	6.335
2017 Yılı Ödeneği(TL)	15.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	42
Fiziki Gerçekleşme (%)	40
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Bu Proje yıl sonu itibariyle; Proje bazında çalışmalar olup , Orman köylülerimizi kalkındırmaya dönük planlama çalışmaları yapılacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ORMAN KADASTRO PROJESİ
Proje No	2014A50040
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	100.000
İhale Bedeli(TL)	100.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	22.339
2017 Yılı Ödeneği(TL)	100.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	22
Fiziki Gerçekleşme (%)	4
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Proje bazında çalışmalar 10.000 Ha. Kadastro çalışması yapılması planlanmıştır. 360 Ha. Sahada çalışma tamamlanmıştır. Arazi ve büro çalışmaları devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE PROJESİ
Proje No	2017A05030
Sektörü ve Altsektörü	TARIM-Ormancılık
Proje Yeri(İlçe)	Muhtelif İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli(TL)	1.302.000
İhale Bedeli(TL)	1.302.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama	52.830
2017 Yılı Ödeneği(TL)	1.302.000
2017 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	4
Fiziki Gerçekleşme (%)	96
Projenin Bugünkü Durumu	Tamamlanacaktır.

Proje Özet Bilgisi

Bu Projede yıl sonu itibariyle;

1-Bina İnşaatları :

B-İkmal Tevsii B.Onarım İnşaatları: 1 adet Yangın Gözetleme kulesi onarım

2-Orman Koruma : 200 adet Kuş Yuvası yapım programı tamamlanmıştır.

4-Tesisler: 40 Km. Yardop Tesisi programına karşılık 38 Km.lik kısmı tamamlanmıştır.





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale sinyalizasyon, telekomünikasyon tesisi yapımı ve altyapı iyileştirilmesi
Proje No	2005.E010130.02
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale
Başlama - Bitiş Tarihi	30.10.2009 – 31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	13.857.722
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	12.301.141
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	1.503
2017 Yılı Ödeneği (TL)	5.619
Nakdi Gerçekleşme (%)	27
Fiziki Gerçekleşme (%)	98
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

- 3. ve 4. hat yapım işi dolayısı ile zaruri olarak sinyalizasyon sistemi kurulum çalışmaları askıya alınan Mersin-Adana kesimi hariç proje kapsamındaki tüm bölgelerde sinyalli işletmeciliğe geçilmiştir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kayseri- Boğazköprü-Ulukişla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale elektrifikasyon tesisleri yapımı
Proje No	2010.E010070.03.01
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale
Başlama - Bitiş Tarihi	23.10.2012 – 31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	6.974.488
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	5.449.932
2017 Yılı İçerisi Harcama (TL)	392.631
2017 Yılı Ödeneği (TL)	941.395
Nakdi Gerçekleşme (%)	41
Fiziki Gerçekleşme (%)	92
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

- Adana-Toprakkale arası devreye alınmıştır.
- Ulukişla - Yenice – Adana - Mersin arasının 2017 yılı ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Toprakkale-Bahçe yeni demiryolunun tünellerinin imalatlarının yapımı
Proje No	2011.E010070.01.02
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Merkez Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli (TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yılı İçerisi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	ihale Aşamasında

Proje Özet Bilgisi

- İhale Aşamasında.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Toprakkale-Bahçe Altyapı tesislerinin yapımı
Proje No	2011.E010070.01.03
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale Merkez Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli (TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği (TL)	500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	ihale Aşamasında
Proje Özet Bilgisi	
• İhale Aşamasında.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Toprakkale-Bahçe Üstyapı ve elektrifikasyon tesisleri yapımı
Proje No	2011.E010070.01.04
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale Merkez Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli (TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği (TL)	100.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	ihale Aşamasında
Proje Özet Bilgisi	
• İhale Aşamasında.	




Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon tesisleri yapımı
Proje No	2011.E010070.04.01
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale Merkez Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli (TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği (TL)	500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	ihale Aşamasında
Proje Özet Bilgisi	
• İhale Aşamasında.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) varyantı altyapı ve üstyapı işleri
Proje No	2011.E010060.05.01
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	26.06.2013 – 01.12.2018
Proje Bedeli (TL)	104.526.512
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	89.135.500
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	14.135.069
2017 Yılı Ödeneği (TL)	20.000.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	70
Fiziki Gerçekleşme (%)	55
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.
Proje Özet Bilgisi	
Bahçe--Nurdağ istasyonları arasında 160 km/h hıza uygun çift hatlı varyant inşa edilecektir.	
Bahçe-Fevzipaşa-Nurdağ arasındaki 35 Km.lik mevcut hat, 17 Km.lik varyant projesi ile 15 Km. kılacaktır. %0 27 olan eğim , %0 16'ya düşecektir.	
108 dakika olan (manevra dahil) toplam süre 10 dakikaya düşecektir.	
Proje kapsamında 9.952 m uzunluğunda çift tüplü tünel ve 1 adet 710 m uzunluğunda aç kapa tünel inşa edilecektir.	
Toplam % 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.	
T1 984 metre ve T2 4300 metre tünellerde ilerleme sağlanmış TBM ile tünel delme çalışmaları devam etmektedir.	

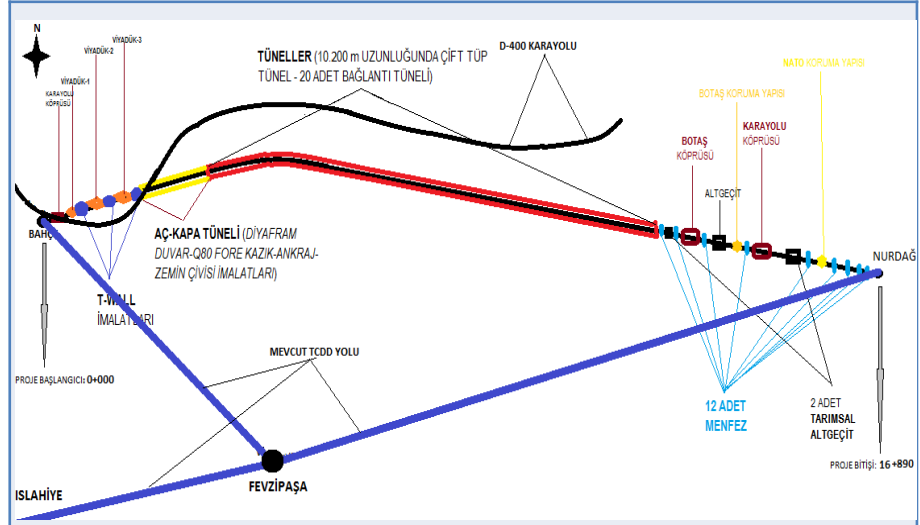

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kadirli OSB Toprakkale Bağlantısı Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
Proje No	2017.E010060.28.37
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli (TL)	
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği (TL)	500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	
Fiziki Gerçekleşme (%)	
Projenin Bugünkü Durumu	İhale aşamasında.
Proje Özet Bilgisi	
• İhale aşamasında.	



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Elektrifikasyon Projesi kapsamında yapılacak olan trafo merkezlerine enerji nakil hattı çekilmesi, proje ve yapım işi
Proje No	2011.E010070.05.01
Sektörü ve Alt Sektörü	Ulaştırma - Demiryolu Ulaştırması
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale Merkez Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	-----
Proje Bedeli (TL)	0
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği (TL)	250.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	ihale Aşamasında

Proje Özet Bilgisi

- İhale Aşamasında.





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



TEİAŞ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Osmaniye TM Yenileme (Farklı sahada)
Proje No	10D030640
Sektörü ve Alt Sektörü	Enerji
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2018
Proje Bedeli (TL)	8.000.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.950.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

24.07.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 26.07.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

İnşaat: Kazı çalışmaları tamamlanmış olup çalışmalar devam ediyor.

Elektrik: Malzeme onayları devam ediyor.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Bahçe - Osmaniye-2 EİH Yenileme (TTFO)
Proje No	12D030810
Sektörü ve Alt Sektörü	Enerji
Proje Yeri (İlçe)	Osmaniye /Merkez -Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	2012-2018
Proje Bedeli (TL)	8.500.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	30.000
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Başlanamayan Proje

Proje Özet Bilgisi

ÇED İhalesine çıkıldı. ÇED Olumlu Kararı Ekim 2017 döneminde alınması bekleniyor. Kamulaştırma imar orman planı ihalesine çıkıldı.28.07.2017 Tarihinde sözleşme imzalandı. 02.08.2017 de yer teslimi yapıldı. Süre 180 gündür.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Berke TM Tevsiat
Proje No	14D030990
Sektörü ve Alt Sektörü	Enerji
Proje Yeri (İlçe)	Bahçe
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2018
Proje Bedeli (TL)	3.500.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2.000
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	1.445.643,5
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	96
Fiziki Gerçekleşme (%)	85
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

İnşaat : İlave şalt binasının boya işleri devam ediyor.% 90

Elektrik : THŞ + Primer projeler onaylandı. Malzeme onayları ve testleri devam ediyor. 170 kV ayırıcı ve kesici, 36 kV ayırıcılar, panolar, 36 kV Akım ve Gerilim trafoları sahaya geldi. Röle Pano montajı yapıldı. %80





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ala camii Restorasyonu
Proje No	
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim-Kültür
Proje Yeri (İlçe)	Kadirli
Başlama - Bitiş Tarihi	21.11.14 -27.02.19
Proje Bedeli (TL)	3.156.541
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	1.493.674
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	396.867
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.662.867
Nakdi Gerçekleşme (%)	70
Fiziki Gerçekleşme (%)	54
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Osmaniye İli Kadirli İlçesinde Bulunan Ala Caminin Restorasyon Çalışmalarında Camii Çevresindeki Müze Müdürlüğü Denetiminde Yapılan Kazı Çalışmaları Tamamlanmıştır. Buna Uygun Güncel Rölöve, Restitüsyon Kurul Tarafından Onaylanmış, Restorasyon Projesi Kısmi Olarak Onaylanmış Restorasyon Çalışmaları Başlamıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	İlbistanlı köyü Hasan Dede Türbesi Proje Temini İşi.
Proje No	
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim-Kültür
Proje Yeri (İlçe)	Kadirli
Başlama - Bitiş Tarihi	07.01.16 - 26.11.17
Proje Bedeli (TL)	9.750
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017 Yılı Ödeneği (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	95
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Osmaniye İli, Kadirli İlçesine Bağlı İlbistanlı Köyünde Bulunan Vakıf Kültür Varlığı Hasan Dede Türbesinin Restorasyonuna Esas Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşinin İhalesi Yapılarak, Yüklenici Firmaya Yer Teslimi Yapılmıştır.

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik Ve Mekanik Projeleri Hazırlanarak İdaremize Teslim Edilmiştir. Projeler Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Onayına Gönderilmiştir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sancaklı Cami Proje Temin İşi
Proje No	
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim-Kültür
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli (TL)	98.797
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017 Yılı Ödeneği (TL)	0
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	İhale Aşamasında

Proje Özet Bilgisi

OSMANIYE İLİ, MERKEZ İLÇESİNDE BULUNAN SANCACLIL CAMİİNİN YENİDEN YAPIMINA ESAS UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ İHALE AŞAMASINDADIR





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama	
BÜYÜK SU İŞLERİ								108.927.940	735.474	3.418.000	2.008.168	2.743.642			
OSMANİYE KADIRLI SAVRUN PROJESİ															
1	Savrun Barajı	2016A010070	Tarım	ÖB	Kadirli	2017	2021	86.792.835	0	1.000	0	0	0	DE	
AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ I.MERHALE PROJESİ															
1	AS0-BS0 İsale Kanallarının Yükseltilmesi	1975A010200	Tarım	ÖB	Merkez	2017	2018	6.251.106	0	1.400.000	848.634	848.634	60	DE	
2	Osmaniye Cevdetiye Regülatörü-Hamis Çayı Mansap Düzenlenmesi (Osmaniye Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Cevdetiye Regülatörü Mansabına Taşınması İçin Deşarj Hattı Yapımı)	1975A010200	Tarım	ÖB	Merkez	2017	2018	7.808.525	0	750.000	742.568	742.568	99	DE	
TOPLAM								100.852.466	0	2.151.000	1.591.202	1.591.202			

Bütçe türü için : GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu),KIT İşletmecisi (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi(İÇ), Dış Kredi(Dİ), Hibe(Hİ),

Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama
BÜYÜK SU İŞLERİ														
3	ASO - BSO İsale Kanalları Yükseltilmesi 2.Kısım	1975A010200	Tarım	ÖB	Merkez	2017	2018	7.000.000	0	1.000	0	0	0	İA
MEHMETLİ BARAJI YÜKSELTİLMESİ PROJESİ														
1	Sumbas İlçesi İçmesuyu Rolekasyon Hattı	1975A010200	Tarım	ÖB	Merkez	2016	2017	1.075.474	735.474	417.000	416.966	1.152.440	99	BT
TOPLAM								8.075.474	735.474	418.000	416.966	1.152.440		

UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur.

Bütçe türü için : GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu), KİT İşletmeci (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi (İÇ), Dış Kredi (DI), Hibe (Hi),

Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama	
KÜÇÜK SU İŞLERİ								105.317.801	22.887.884	29.000.791	28.998.264	51.886.148			
TAŞKIN KORUMA															
1	Osmaniye-Merkez Karaçay Deresi 3.Kısım	1977A010320	Tarım	ÖB	Merkez	2016	2017	10.699.368	704.142	5.417.250	5.417.206	6.121.348	99	DE	
2	Osmaniye Merkez Karacaören Kuşaklama Kanalı 2.Kısım	1977A010320	Tarım	ÖB	Merkez	2015	2017	5.614.596	4.473.776	953.000	952.209	5.425.985	99	BT	
3	Osmaniye-Kadirli İncehalik, Aktaş ve Domuzdağı Dereleri	1977A010320	Tarım	ÖB	Kadirli	2016	2018	11.446.774	899.855	3.734.800	3.734.126	4.633.981	99	DE	
4	Osmaniye-Bahçe İlçesi Aslanlı Deresi Islahı	1977A010320	Tarım	ÖB	Bahçe	2016	2017	6.777.118	1.226.703	3.588.300	3.588.241	4.814.944	99	DE	
5	Osmaniye Merkez Karaçay Deresi Üzerine Köprü Yapımı	1977A010320	Tarım	ÖB	Merkez	2016	2017	2.211.036	0	1.343.000	1.342.953	1.342.953	99	DE	
6	Osmaniye Kadirli İlçesi Savrun Çayı 3.Kısım	1977A010320	Tarım	ÖB	Kadirli	2018	2019	10.000.000	0	0	0	0	0	İA	
7	Osmaniye-Bahçe Yerleşim Alanının Koca Bekdemir (Bilalilik), Harami ve Kar Dereleri 2.Kısım	1977A010320	Tarım	ÖB	Bahçe	2018	2019	12.000.000	0	0	0	0	0	İA	
TOPLAM								58.748.892	7.304.476	15.036.350	15.034.735	22.339.211	25		

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama
KÜÇÜK SU İŞLERİ								29.204.878	6.867.377	13.405.441	13.405.032	20.272.409		
TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU														
1	Osmaniye-Bahçe İlçe Merkezi Horu Çayı	1977A010320	Tarım	ÖB	Bahçe	2016	2018	11.756.032	0	4.392.000	4.391.743	4.391.743	99	DE
2	Osmaniye-Düziçi Atalan Deresi Islahı	1977A010320	Tarım	ÖB	Düziçi	2015	2017	6.161.906	5.596.007	201.049	201.023	201.049	99	BT
3	Osmaniye-Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü İçerisinden Geçen Derelerin Islahı 1.Kısım (Yıldızlar-Oğmaca-Keklik-Mamo)	1977A010320	Tarım	ÖB	Düziçi	2016	2017	6.227.118	872.185	5.318.000	5.317.898	6.190.083	99	BT
4	Osmaniye-Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü İçerisinden Geçen Derelerin Islahı 2.Kısım (Kurtgözü-Koca-Ağdere-Çığıranlı-Tedirli-Kirazlı)	1977A010320	Tarım	ÖB	Düziçi	2016	2017	5.059.822	399.185	3.494.392	3.494.368	3.893,553	99	DE
TOPLAM								29.204.878	6.867.377	13.405.441	13.405.032	20.272.409	46	

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama	
KÜÇÜK SU İŞLERİ								17.364.031	8.716.031	559.000	558.497	9.274.528			
GÖLET VE SULAMALARI															
1	Osmaniye-Düziçi Karacaören Göleti ve Sulaması	1977A010320	Tarım	ÖB	Düziçi	2013	2017	10.364.031	8.716.031	559.000	558.497	9.274.528	99	BT	
2	Osmaniye-Kadirli Oruçbey Göleti ve Sulaması	1977A010320	Tarım	ÖB	Kadirli	2018	2019	7.000.000	0	0	0	0	0	İA	
TOPLAM								17.364.031	8.716.031	559.000	558.497	9.274.528	53		

UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur.

Bütçe türü için : GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu), KİT İşletmecisi (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi (İÇ), Dış Kredi (DI), Hibe (Hİ),

Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama
PROJE YAPIMI								20.768.781	2.174.703	4.895.644	2.696.646	4.871.349		
PROJE YAPIMI														
1	Sabunsuyu Çatak Barajı Planlama ve Proje Yapımı	1985A010020	Tarım	ÖB	Düziçi	2015	2017	2.150.000	116.820	2.033.180	858.209	975.029	42	DE
2	Osmaniye-Kadirli Savrun Barajı Sulaması Proje Yapımı	1985A010020	Tarım	ÖB	Kadirli	2016	2018	1.196.000	72.173	481.650	79.892	152.065	16	DE
3	Aşağı Ceyhan Kesiksuyu Mehmetli Barajı I. II. Merhale Sulamaları yonu Proje Yapımı	1985A010020	Tarım	ÖB	Kadirli	2016	2018	2.688.000	85.892	478.795	189.430	275.322	39	DE
TOPLAM								11.034.000	274.885	3.326.528	1.127.531	1.402.416		

UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur.

Bütçe türü için : GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu),KİT İşletmecisi (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi(İÇ), Dış Kredi(Dİ), Hibe(Hİ),

Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama	
PROJE YAPIMI															
PROJE YAPIMI															
1	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 9. Grup Göletleri Planlama ve Proje Raporu Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi (Osmaniye Kadirli Oruçbey)	1985A010020	Tarım	ÖB	Kadirli	2014	2017	4.194.781	1.798.810	963.068	963.067	2.761.877	99	DE	
TOPLAM								4.194.781	1.798.810	963.068	963.067	2.761.877	0		

UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur.

Bütçe türü için: GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu), KİT İşletmecisi (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi (İÇ), Dış Kredi (DI), Hibe (HI),

Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama
PROJE YAPIMI														
PROJE YAPIMI														
2	DSİ 6.Bölge Müdürlüğü 10.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (İnderesi Göleti)	1985A010020	Tarım	ÖB	Bahçe	2016	2017	5.540.000	101.008	606.048	606.048	707.056	100	DE
TOPLAM								5.540.000	101.008	606.048	606.048	707.056	0	

UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur.

Bütçe türü için : GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu),KİT İşletmeci (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi(İÇ), Dış Kredi(Dİ), Hibe(Hİ),

Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama
PROJE YAPIMI														
PROJE YAPIMI														
3	13.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Osmaniye Merkez Yarpuz)	1985A010020	Tarım	ÖB	Merkez	2017	2018	5.000.000	0	332.903	0	0	0	İA
TOPLAM								5.000.000	0	332.903	0	0	0	

UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur.

Bütçe türü için : GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu),KİT İşletmecisi (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi(İÇ), Dış Kredi(Dİ), Hibe(Hİ),

Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama	
PLANLAMA								929.000	218.300	835.700	825.116	1.043.416			
PLANLAMA															
1	DSİ 6.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü İstikşaf Raporu (Osmaniye-Kadirli Savrun Çayı III. Kısım)	1985A010020	Tarım	ÖB	Kadirli	2017	2018	305.000	218.300	86.700	76.700	295.000	88	BT	
TOPLAM								305.000	218.300	86.700	76.700	295.000			

UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur.

Bütçe türü için: GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu), KİT İşletmecisi (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi(İÇ), Dış Kredi(Dİ), Hibe(Hİ),

Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Yatırım Projeleri İzleme Raporu

Sıra No	Proje Adı	Proje Numarası	Sektörü	Bütçe Türü	Proje Yeri (İlçe)	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL)	2017 Yılı Harcamaları (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Açıklama
PLANLAMA														
PLANLAMA														
2	DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 2.Kısım Taşkın Kontrol ve Taşkın Rüşubat Kontrol Planlama Raporu ve Proje Yapımı Mühendislik Hizmetleri (Osmaniye-Merkez Çona (Hacıgüllü), Osmaniye-Hasanbeyli, Almanpınarı, Mescit ve Küçükdere Dereleri)	1985A010020	Tarım	ÖB	Merkez Hasanbeyli	2017	2018	624.000	0	749.000	748.416	748.416		DE
TOPLAM								624.000	0	749.000	748.416	748.416		

UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur.

Bütçe türü için : GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu), KİT (İşletmeci (KT), KİT Özelleştirme kapsamında (ÖK), İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İÇ Kredi(İÇ), Dış Kredi(Dİ), Hibe(Hİ),



Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Savrun Barajı
Proje No	85A010020
Sektörü ve Alt Sektörü	Sulama, Enerji
Proje Yeri (İlçe)	Kadirli İlçesi
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2021
Proje Bedeli (TL)	86.792.835
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1000
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

21.07.2017 Tarihinde iş yeri teslimi yapılarak, işe başlanmıştır.

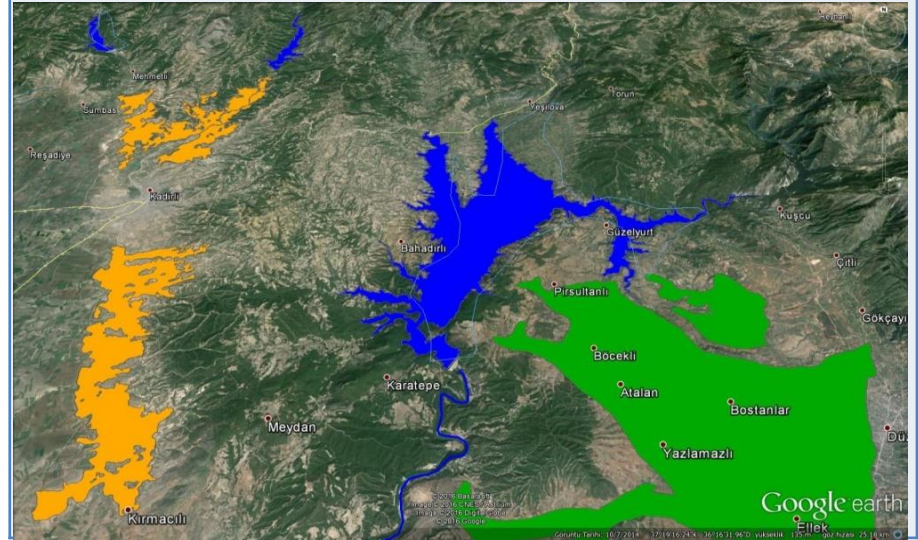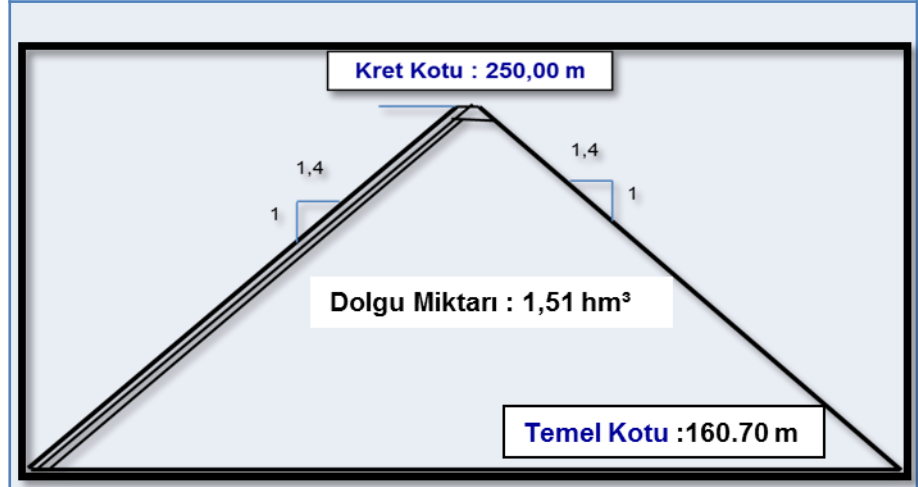

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	AS0-BS0 İsale Kanallarının Yükseltilmesi
Proje No	93A010410
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım, Sulama
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli (TL)	6.251.106
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.400.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	60
Fiziki Gerçekleşme (%)	20
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi


06.02.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Osmaniye Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Cevdetiye Regülatörü Mansabına Taşınması İçin Deşarj Hattı Yapımı
Proje No	93A010410
Sektörü ve Alt Sektörü	Sulama, Enerji
Proje Yeri (İlçe)	Kadirli İlçesi
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli (TL)	86.792.835
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	742.568
2017 Yılı Ödeneği (TL)	750.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	99
Fiziki Gerçekleşme (%)	9
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor
Proje Özet Bilgisi	

Sözleşmesi 08.06.2017 tarihinde yapılarak 16.06.2017 tarihinde işe başlanılmıştır.

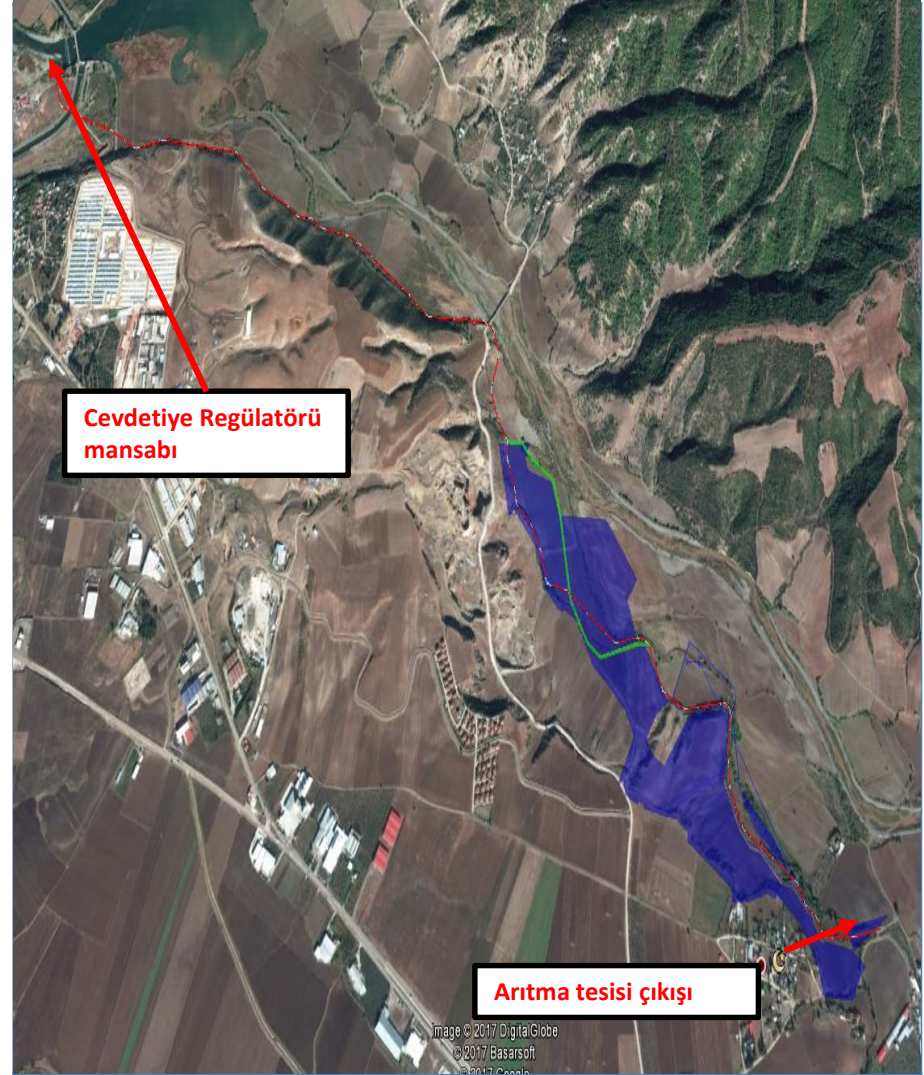



T.C.
OSMANIYE VALİLİĐİ



Orman ve Su İŐleri BakanlıĐı

7. Bölge MüdürlüĐü



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) Seyir Kulesi ve Giriş Takı (Tak+Wc+Depo+Giriş Kontrol Kulübesi) yapımı
Proje No	2015K100140
Sektörü ve Alt Sektörü	DKH –Sosyal- Çevre
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	27.07.2017- devam ediyor
Proje Bedeli (TL)	250.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	250.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	16
Projenin Bugünkü Durumu	Yapımı Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırlarında 2015 yılında yapımı tamamlanmış olan Ziyaretçi ve Ekosistem Bilgilendirme Merkezi Çevre Düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları dahilinde ziyaretçi memnuniyeti amaçlanmaktadır.





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



HATAY TAPU VE KADASTRO 12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	OSM-DZC
Proje No	12-22
Sektörü ve Alt Sektörü	D.K.H - İktisadi
Proje Yeri (İlçe)	DÜZİÇİ
Başlama - Bitiş Tarihi	15.11.2016-09.03.2018
Proje Bedeli (TL)	882.588,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	96.626,20
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	343.872,65
2017 Yılı Ödeneği (TL)	785.961.80
Nakdi Gerçekleşme (%)	50
Fiziki Gerçekleşme (%)	54
Projenin Bugünkü Durumu	ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Proje Özet Bilgisi

OSMANİYE İLİ DÜZİÇİ İLÇESİNDE 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 22/A MADDESİ UYARINCA YAPILAN SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞİ 34 BİRİMDE DEVAM ETMEKTEDİR.



Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Proje No	2017H035420
Sektörü ve Alt Sektörü	Yüksek Öğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2017
Proje Bedeli (TL)	100.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	165.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Proje Çalışmaları Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Kadirli Yemekhane Projesi tamamlanmış olup, Rektörlük Ek Binası ve Rektörlük Konutu Binası Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin yapılması hizmet alımı işi için harcanacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje No	2009H032130
Sektörü ve Alt Sektörü	Yüksek Öğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2009-2019
Proje Bedeli (TL)	12.000.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	7.697.000,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.000.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Projelendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Şoförler Odası taşınması, muhtelif çevre düzenlemesi-Peyzajı işleri ve otopark yapılması, muhtelif binaların doğalgaz dönüşümü yapılması işleri başta olmak üzere tüm Yerleşkenin sulama ve çevre düzeni-peyzajı projelendirme ve uygulama çalışmalarını kapsayan ihale süreci devam etmektedir. Yerleşkenin tamamını kapsayan Drenaj ve kanalizasyon projesini, elektrik altyapısının geliştirilmesini kapsayan Diğer Altyapı projelendirme ihale çalışmaları devam etmektedir. Bu projenin yıl için düşünülen kısmının bedeli için bu yılki ödenek kullanılacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje No	2009H032140
Sektörü ve Alt Sektörü	Yüksek Öğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2009-2019
Proje Bedeli (TL)	131.500.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	100.299.000,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	12.457.966,84
2017 Yılı Ödeneği (TL)	16.600.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	75
Fiziki Gerçekleşme (%)	85
Projenin Bugünkü Durumu	Çalışmalar Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan Enstitü Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, İlahiyat fakültesi Binası ve Bahçe MYO Binası İnşaatları işi devam etmektedir. Bu projelerin devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır.

KADIRLI UYG.BİL. BİNASI İNŞAATI



İLAHIYAT FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje No	2009H032140
Sektörü ve Alt Sektörü	Yüksek Öğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2009-2019
Proje Bedeli (TL)	131.500.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	100.299.000,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	12.457.966,84
2017 Yılı Ödeneği (TL)	16.600.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	75
Fiziki Gerçekleşme (%)	85
Projenin Bugünkü Durumu	Çalışmalar Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Derslik Birimleri ve Merkezi Birimler Projesi içinde yer alan Enstitü Binası, Kadirli Uygulamalı Bilimler Binası, İlahiyat fakültesi Binası ve Bahçe MYO Binası İnşaatları işi devam etmektedir. Bu projelerin devamı için ödeneğin tamamı harcanacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Lojman ve Sosyal Tesisler
Proje No	2009H032150
Sektörü ve Alt Sektörü	Yüksek Öğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2009-2017
Proje Bedeli (TL)	2.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çalışmalar Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Lojman ve Sosyal Tesisler işimizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje No	2017H035450
Sektörü ve Alt Sektörü	Yüksek Öğretim-Büyük onarım projesi
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2017
Proje Bedeli (TL)	4.896.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	2.067.995,63
2017 Yılı Ödeneği (TL)	6.436.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	32
Fiziki Gerçekleşme (%)	40
Projenin Bugünkü Durumu	Çalışmalar Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Büyük onarım projesi ödeneğinin tamamı bina onarım işlerinde kullanılacaktır. Ödenek, yapılan ve diğer tüm Üniversitenin ihtiyacına yönelik yapılması planlanan bakım onarım çalışmalarını dikkate alınarak kullanılacaktır. Diğer Kitap alımı ve Bilgi Teknolojileri için ihale süreci devam etmektedir. Yayın Alımı ve Bilgi Teknolojileri ödeneklerinin kalan kısmı harcanacaktır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kamulaştırma Ödeneği
Proje No	
Sektörü ve Alt Sektörü	Yüksek Öğretim
Proje Yeri (ilçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2017
Proje Bedeli (TL)	0,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çalışmalar Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Bu yıl Kamulaştırma ödeneği olmamasından dolayı hiçbir çalışma yapılamamıştır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje No	2008H050160
Sektörü ve Alt Sektörü	Yüksek Öğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2008-2018
Proje Bedeli (TL)	100.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	211.469,02
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.802.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	12
Fiziki Gerçekleşme (%)	20
Projenin Bugünkü Durumu	Çalışmalar Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Ödeneğin tamamının kullanılacağı, inşaatı devam eden OKÜ Açık Spor Tesisleri Projesi devam etmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Proje No	2010K121290
Sektörü ve Alt Sektörü	Teknolojik Araştırma
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2017
Proje Bedeli (TL)	12.642.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	11.642.000,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	500.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	0
Projenin Bugünkü Durumu	Çalışmalar Devam Ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Teknolojik Araştırma Ödeneği
Üniversitemizin araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında öğretim mensuplarının araştırma çalışmalarını yürütebileceği yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarının eksikleri ile donanım ve cihazlarının alımında kullanılacaktır.





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



İL KOORDİNASYON KURULU
4. DÖNEM TOPLANTISI
10.10.2017




YOL ONARIMI

2017 Yılı Proje Sayısı	30 Adet (85 Km)
Proje Bedeli	4.496.474,50 TL.
Biten Proje Sayısı	24 Adet (75,5 Km)
Devam Eden Proje Sayısı	-
Başlanmayan Proje Sayısı	6 Adet (17,5 Km)
Toplam Harcama	3.993.927,35 TL.

Proje Özet Bilgisi

2017 Yılı Yatırım Programında 85 Km Onarım bulunmaktadır.
Yollarımızın acil ihtiyaçları doğrultusunda 6 km ek onarım yapılmıştır.

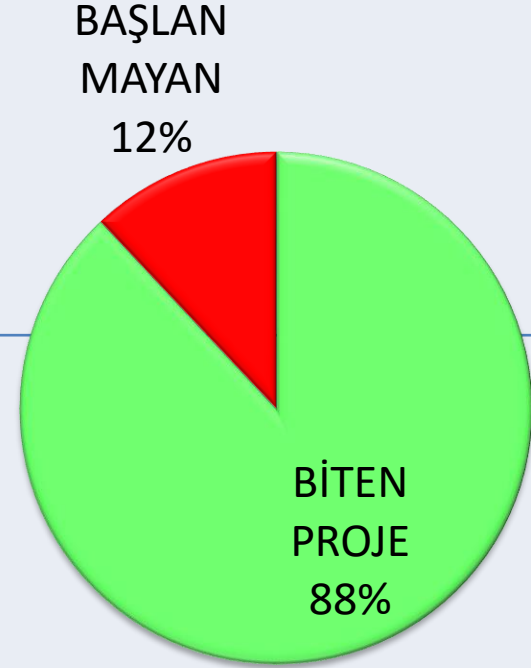

UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.




STABİLİZE

2017 Yılı Proje Sayısı	105 Adet (295,3 Km)
Proje Bedeli	3.364.411,96 TL.
Biten Proje Sayısı	105 Adet (327,3 Km)
Devam Eden Proje Sayısı	-
Başlanmayan Proje Sayısı	-
Toplam Harcama	3.728.994,36 TL.

Proje Özet Bilgisi

2017 Yılı Yatırım Programında 295,3 Km Stabilize bulunmaktadır. Yollarımızın acil ihtiyaçları doğrultusunda 32 km ek stabilize yapılmıştır.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



1. KAT ASFALT


2017 Yılı Proje Sayısı	51 Adet (96,05 Km)
Proje Bedeli	7.779.340,19 TL.
Biten Proje Sayısı	51 Adet (103,2 Km)
Devam Eden Proje Sayısı	-
Başlanmayan Proje Sayısı	-
Toplam Harcama	8.358.437,35 TL.

Proje Özet Bilgisi

**2017 Yılı Yatırım Programında
93,25 Km**

**1. Kat Asfalt bulunmaktadır. Yollarımızın
acil ihtiyaçları doğrultusunda
5 adet (12 Km) proje İPTAL edilerek
yerine 9 Adet (12,8 Km) programa
eklenmiştir.**

**7,2 Km yollarımıza ek 1. Kat Asfalt
yapılmıştır.**

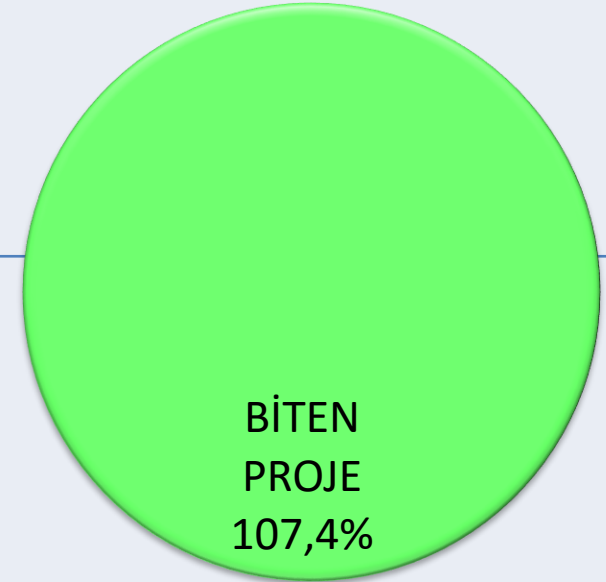

UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.




2. KAT ASFALT

2017 Yılı Proje Sayısı	31 Adet (92,5 Km)
Proje Bedeli	2.241.968,75 TL.
Biten Proje Sayısı	31 Adet (89,7 Km)
Devam Eden Proje Sayısı	-
Başlanmayan Proje Sayısı	-
Toplam Harcama	2.174.103,75 TL.

Proje Özet Bilgisi

2017 Yılı Yatırım Programında 112 Km 2. Kat Asfalt bulunmaktadır. Yollarımızın acil ihtiyaçları doğrultusunda 8 adet proje İPTAL edilerek yerine 1 Adet 2.Kat Asfalt Kaplama ve 9 Adet 1.Kat Asfalt Kaplama programa eklenmiştir.

BİTEN
PROJE
103,2%




UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



İÇME SUYU

2017 Yılı Proje Sayısı	47 Adet
Proje Bedeli	4.536.314,58 TL.
Biten Proje Sayısı	26 Adet
Devam Eden Proje Sayısı	16 Adet
Başlanmayan Proje Sayısı	5 Adet
Toplam Harcama	3.090.490,38 TL.

Proje Özet Bilgisi

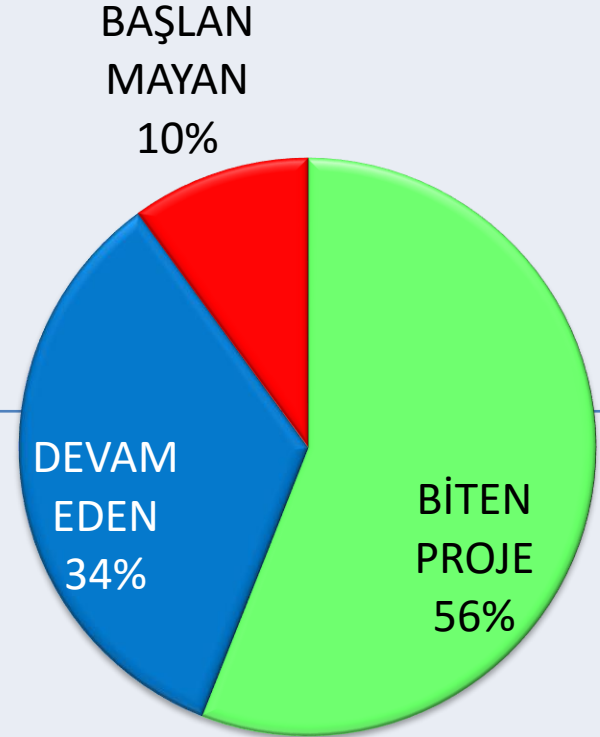


UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



TARIM

2017 Yılı Proje Sayısı	9 Adet
Proje Bedeli	625.000,00 TL.
Biten Proje Sayısı	-
Devam Eden Proje Sayısı	1 Adet
Başlanmayan Proje Sayısı	6 Adet
Toplam Harcama	-
İhale Aşamasında Proje	2 Adet

Proje Özet Bilgisi

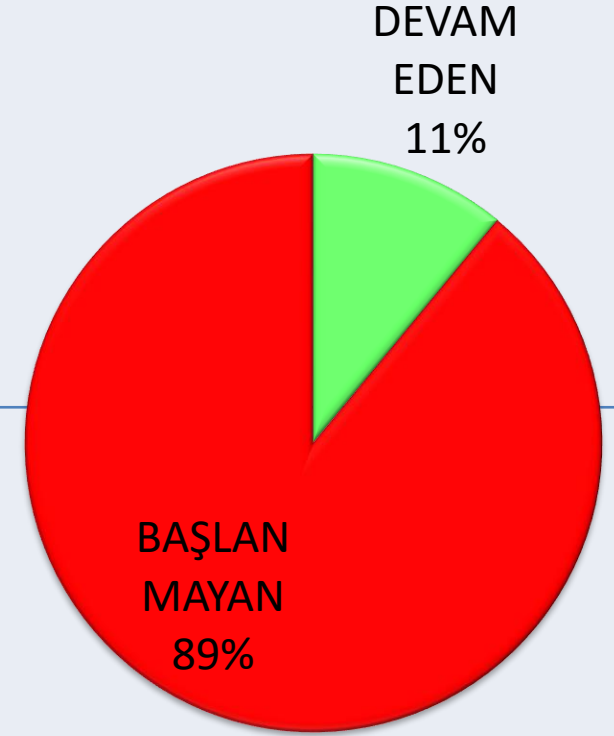

UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



KANALİSAYSON

2017 Yılı Proje Sayısı	1 Adet
Proje Bedeli	300.000,00 TL.
Biten Proje Sayısı	-
Devam Eden Proje Sayısı	-
Başlanmayan Proje Sayısı	1 Adet
Toplam Harcama	-

Proje Özet Bilgisi

UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



PROJELERLE İLGİLİ GÖRSELLER



MERKEZ KAZMACALI 1. KAT ASFALT



DÜZİÇİ PİRSULTANLI 1. KAT ASFALT



HASANBEYLİ KARAYİĞİTLİ 2. KAT ASFALT



MERKEZ LALEGÖLÜ 2. KAT ASFALT

PROJELERLE İLGİLİ GÖRSELLER



BAHÇE YUKARI ARICAKLI 1.KAT ASFALT



KADİRLİ AZAPLI 2. KAT ASFALT



BAHÇE BEKDEMİR ONARIM



KADİRLİ YELİŞYAYLA-BAĞDAŞ ARASI STABİLİZE



SAĞLIK, SOSYAL , KÜLTÜR, GÜVENLİK V.B YATIRIMLAR

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
	Merkez Özden Huzurevi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi	Merkez	0,00	868.300,00	874.891,90	874.891,90	100	BİTTİ
	Osmaniye Merkez Yağlı Tahumlar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Merkez	1.710.052,86	9.037.230,45	12.153.410,00	4.616.450,05	50	DEVAM EDİYOR
	Osmaniye Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Kadirli	1.465.526,97	5.764.892,70	7.233.400,00	3.815.065,84	75	DEVAM EDİYOR
	Hasanbeyli İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Hasanbeyli	419.060,43	3.726.032,05	4.147.700,00	276.999,36	20	DEVAM EDİYOR
	Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Toprakkale	0,00	4.514.056,00	4.514.680,00	1.285.600,43	23	DEVAM EDİYOR
	Düziçi İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Düziçi	0,00	7.195.092,48	7.198.000,00	1.599.713,92	20	DEVAM EDİYOR
TOPLAM			10.693.358,88	119.943.360,40	244.307.477,71	39.894.251,28		





T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ



OSMANİYE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Ticaret Meslek Lisesi
Proje No	1993H020030
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2013 - 2017
Proje Bedeli (TL)	12.240.803,87
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	4.615.528,40
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	6.794.874,22
2017 Yılı Ödeneği (TL)	10.770.709,45
Nakdi Gerçekleşme (%)	93
Fiziki Gerçekleşme (%)	92
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Merkez ilçe, Çardak Köyü, 208 Ada, 1 Parsel numaralı, 11.032,24m² yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine, 24 Derslikli Yeni Ticaret Meslek Lisesi binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonu
Proje No	1990H021270
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2013 - 2017
Proje Bedeli (TL)	9.980.440,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	1.973.190,22
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	5.896.487,07
2017 Yılı Ödeneği (TL)	7.919.010,43
Nakdi Gerçekleşme (%)	79
Fiziki Gerçekleşme (%)	79
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Merkez ilçe, Fakiuşağı Mahallesi, 791 Parsel numaralı, 76.015,39m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine, 300 Öğrenci Kapasiteli Yeni Pansiyon binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Halk Eğitim Merkezi
Proje No	1990H021260
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale
Başlama - Bitiş Tarihi	2015 - 2017
Proje Bedeli (TL)	4.720.451,94
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	4.466.766,52
2017 Yılı Ödeneği (TL)	4.529.204,70
Nakdi Gerçekleşme (%)	95
Fiziki Gerçekleşme (%)	97
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Toprakkale İlçesi, Karataş Mahallesi, 346 Ada, 42 Parsel numaralı, 7.042,69m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine, 8 Derslikli Yeni Halk eğitim Merkezi binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Atölye (Sumbas Çok Prog. And. Lisesi)
Proje No	2015H020160
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri (İlçe)	Sumbas
Başlama - Bitiş Tarihi	2015 - 2017
Proje Bedeli (TL)	3.148.240,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.092.541,86
2017 Yılı Ödeneği (TL)	989.798,90
Nakdi Gerçekleşme (%)	35
Fiziki Gerçekleşme (%)	60
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Sumbas İlçesi, Karaömerli Mahallesi, 205 Ada, 1 Parsel numaralı, 50.175,10m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesine, 1 Adet Yeni Atölye binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Atölye (Hasanbeyli Çok Prog. And. Lisesi)
Proje No	2015H020160
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri (İlçe)	Hasanbeyli
Başlama - Bitiş Tarihi	2015 - 2017
Proje Bedeli (TL)	3.124.640,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.098.557,79
2017 Yılı Ödeneği (TL)	986.666,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	35
Fiziki Gerçekleşme (%)	60
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Hasanbeyli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 279 Ada, 3 Parsel numaralı, 4.937,48m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesine, 1 Adet Yeni Atölye binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.

Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Halk Eğitim Merkezi
Proje No	1990H021260
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – Mesleki ve Teknik Eğitim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2014 - 2017
Proje Bedeli (TL)	6.831.020,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	4.063.952,35
2017 Yılı Ödeneği (TL)	4.109.940,48
Nakdi Gerçekleşme (%)	59
Fiziki Gerçekleşme (%)	45
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Merkez ilçe, Fakıuşağı Mahallesi, 279 Ada, 1 Parsel numaralı, 13.279,53m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine, 12Derslikli Yeni Halk eğitim Merkezi binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Bilim Sanat Merkezi
Proje No	2012H010020
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – ilköğretim ve Gen. Ortaöğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2015 - 2017
Proje Bedeli (TL)	4.260.980,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yılı İçer Harcama (TL)	1.675.756,80
2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.192.812,48
Nakdi Gerçekleşme (%)	39
Fiziki Gerçekleşme (%)	40
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Merkez ilçe, Fakiuşağı Mahallesi, 279 Ada, 1 Parsel numaralı, 13.279,53m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine, 12Derslikli Yeni Bilim Sanat Merkezi binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	İlbistanlı İlkokulu
Proje No	MEB.2014.12.İO
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
Proje Yeri (İlçe)	Kadirli
Başlama - Bitiş Tarihi	2016 - 2018
Proje Bedeli (TL)	5.521.220,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	597.110,43
2017 Yılı Ödeneği (TL)	7.000.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	11
Fiziki Gerçekleşme (%)	11
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Kadirli İlçesi, İlbistanlı Köyü, 131 Ada, 36 Parsel numaralı, 21.300,00m² yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine, 12Derslikli Yeni İlkokul binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Haciosmanlı İmam Hatip Ortaokulu
Proje No	MEB.2014.32.İHL.Rev.
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
Proje Yeri (İlçe)	Merkez
Başlama - Bitiş Tarihi	2017 - 2018
Proje Bedeli (TL)	11.505.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	2.270.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	2
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Merkez ilçe, Haciosmanlı Mahallesi, 2 Ada, 1 Parsel numaralı, 13.279,53m² yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine, 32Derslikli Yeni İmam Hatip Ortaokulu binası yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Atatürk Ortaokulu – Ek Bina
Proje No	MEB.2014.12.00
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim – İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim
Proje Yeri (İlçe)	Toprakkale
Başlama - Bitiş Tarihi	2016 - 2018
Proje Bedeli (TL)	5.487.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	1.739.482,74
2017 Yılı Ödeneği (TL)	6.200.000,00
Nakdi Gerçekleşme (%)	32
Fiziki Gerçekleşme (%)	31
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje; Toprakkale İlçesi, Dağistan Mahallesi, 421 Ada, 39 Parsel numaralı, 6.992,00m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerine, 12Derslikli Ek bina yapım işidir.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



T.C. Sağlık Bakanlığı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırımcı Kuruluş Raporu

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

	TOPLAM	Sektör adı-1	Sektör adı-2	Sektör adı-3	Sektör adı-4	Sektör adı-5
Projelerin Genel Durumu						
Proje Sayısı	13	SAĞLIK				
Proje Tutarı (TL)	256.776.586,00 TL.					
Projelerin Ödenek Durumları						
Merkezi Bütçe (TL)	3.988.801,42 TL.					
Öz Kaynak (TL)						
Dış Kredi (TL)						
İç Kredi (TL)						
Hibe (TL)						
2017 Yılı Toplam Ödenegi (TL)						
Projelerin Parasal Gerçekleşme Durumu						
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)						
2017 Yılı Harcaması (TL)						
Toplam Harcama						
Parasal Gerçekleşme (Yüzde)						
Projelerin Fiziki Gerçekleşme Durumu						
Başlanamayan Proje Sayısı	11					
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	-					
Yarım Kalan Proje Sayısı	-					
Devam Eden Proje Sayısı	2					
Biten Proje Sayısı	-					
Toplam Proje Sayısı	13					

UYARI: Sektör Adları için; Tarım, Madencilik, İmalat, Ulaştırma, Turizm, Konut, Eğitim, Sağlık, Diğer Kamu Hizmetleri kullanılacaktır. Kurumların görev alanlarına göre başlıklara sektör adlarını eklemeleri gerekmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	KARAGEDİK SAĞLIK EVİ
Proje No	
Sektörü ve Alt Sektörü	SAĞLIK
Proje Yeri (İlçe)	DÜZİÇİ
Başlama - Bitiş Tarihi	19.09.2017 – 17.12.2017
Proje Bedeli (TL)	228.556,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	0,00
Fiziki Gerçekleşme (%)	1
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Düziçi İlçesi Karagedik Köyünde 1.200,00 m² arsa üzerine 95,00 m² oturma alanı olmak üzere toplam 193,55 m² kapalı alana sahip 2 katlı olarak yapılacaktır.

Zemin katı sağlık evi hizmet binası, 1. katı ebe lojmanı olarak kullanılacaktır.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	TUFANPAŞA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU
Proje No	
Sektörü ve Alt Sektörü	SAĞLIK
Proje Yeri (ilçe)	KADIRLI
Başlama - Bitiş Tarihi	15.09.2017-13.12.2017
Proje Bedeli (TL)	341.020.00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	0,00
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	0,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	
Nakdi Gerçekleşme (%)	0
Fiziki Gerçekleşme (%)	1
Projenin Bugünkü Durumu	

Proje Özet Bilgisi

Kadirli İlçesi, Tufanpaşa Mahallesinde 2.205,00 m² arsa üzerine 204,45 m² oturma alanına sahip olmak üzere tek katlı olarak yapılacaktır.



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	KADIRLI EK TRİBÜN YAPIMI TAMAMLANMASI VE BOCCE OYUN SAHASI
Proje No	1
Sektörü ve Alt Sektörü	
Proje Yeri (İlçe)	MERKEZ
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli (TL)	3.578.000,00
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	
2017 Yılı İçerisi Harcama (TL)	250.465,00
2017 Yılı Ödeneđi (TL)	2.530.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	25
Fiziki Gerçekleşme (%)	15
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaat Halinde

Proje Özet Bilgisi




UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	KADIRLI YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU
Proje No	2
Sektörü ve Alt Sektörü	
Proje Yeri (İlçe)	MERKEZ
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli (TL)	5.000.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	3.360.202,00
2017 Yılı Ödeneği (TL)	500.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	70
Fiziki Gerçekleşme (%)	80
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaat Halinde

Proje Özet Bilgisi

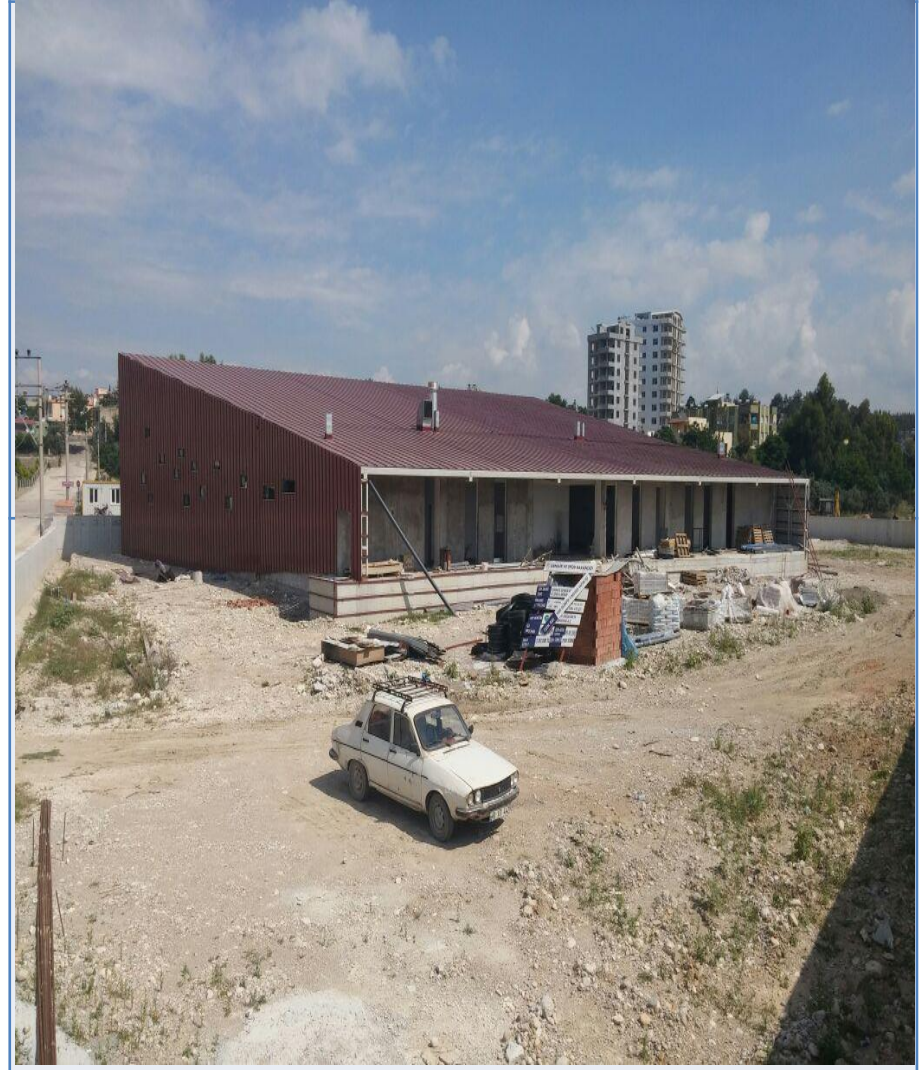

UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sumbas Sentetik Zeminli Futbol Sahası
Proje No	3
Sektörü ve Alt Sektörü	
Proje Yeri (İlçe)	SUMBAS
Başlama - Bitiş Tarihi	
Proje Bedeli (TL)	1.950.000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	
2017 Yılı Ödeneği (TL)	1.750.000
Nakdi Gerçekleşme (%)	40
Fiziki Gerçekleşme (%)	45
Projenin Bugünkü Durumu	İnşaat Halinde

Proje Özet Bilgisi



UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTINIZ.





T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ



İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi
Proje No	1
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım, Bitkisel Ürünler
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	70.988
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	--
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	66.942
2017 Yılı Ödeneği (TL)	70.988
Nakdi Gerçekleşme (%)	94
Fiziki Gerçekleşme (%)	75
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje çerçevesinde il genelinde ürünlerin durumu sürekli olarak gözlemlenerek üreticilere hastalık, zararlı ve yetiştiricilik konusunda bilgi aktarılmakta, hasat ve depolama kontrolleriyle gerekli uyarılar yapılmaktadır.

Bunun yanında bitkisel üretim konusunda destekleme ödemeleri için gerekli tespitler ve işlemler yapılmaktadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele
Proje No	2
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım, Hayvancılık
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	145.981
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	41.430
2017 Yılı Ödeneği (TL)	145.981
Nakdi Gerçekleşme (%)	28
Fiziki Gerçekleşme (%)	75
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje çerçevesinde büyükbaş, küçükbaş, tek tırnaklı, kedi, köpek, kanatlı, arı ve su ürünleri kayıtları tutularak ilgili sistemlere işlenmekte, aşılama ve küpeleme çalışmaları yapılmakta, hayvan nakilleri, konaklama ve satış yerleri ile ilgili ruhsatlandırma ve denetimler gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanında hayvancılık konusunda destekleme ödemeleri için gerekli tespitler ve işlemler yapılmaktadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi
Proje No	3
Sektörü ve Alt Sektörü	Eğitim, Tarım
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	48.484
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	42.899
2017 Yılı Ödeneği (TL)	48.484
Nakdi Gerçekleşme (%)	88
Fiziki Gerçekleşme (%)	75
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Proje çerçevesinde Bakanlığımız faaliyet alanına giren her konuda, yörenin tarımsal potansiyeli ve ürün desenine göre eğitim ve yayım faaliyetleri sürdürülmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Tarım Arazilerinin Devir Ve Takip Sistem Projesi
Proje No	4
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım, Kırsal Planlaması
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	31.635
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	14.004
2017 Yılı Ödeneği (TL)	31.635
Nakdi Gerçekleşme (%)	44
Fiziki Gerçekleşme (%)	50
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje çalışmaları ile ; Tarım arazilerinin satış, hibe, takas ile devir yolu işlemleri yapılmakta, Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirilmekte, Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devri sağlanmakta, Tarım arazilerinin değer tespitleri yapılmaktadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi
Proje No	5
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım, Eğitim
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	84.994
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	51.581
2017 Yılı Ödeneği (TL)	84.994
Nakdi Gerçekleşme (%)	61
Fiziki Gerçekleşme (%)	75
Projenin Bugünkü Durumu	Devam Ediyor

Proje Özet Bilgisi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında hazırladığımız **“Osmaniye’de Kadın Eliyle Safran Yetiştiriciliği Projesi”** Bakanlığımızdan destek almaya hak kazanmıştır. Proje 2017 yılında Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerimizde yürütülmektedir. Proje ortağımız Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’dür.

“Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde 18-40 yaş arası 91 kadın çiftçilerimize İl Müdürlüğümüz ve İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmiştir.





İŞKUR
Türkiye İş Kurumu

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
OSMANİYE İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB

TARIMDA GENÇ GİRİŞİMCİ KADINLAR GÜÇLENİYOR

- Bitkisel Üretim
- Hayvansal Üretim
- El Sanatları
- İşleme, Pazarlama, Aile İşletmeciliği
- Kırsal Turizm

**UYGULAMALI
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ**

**Son Başvuru Tarihi
28 Şubat 2017**

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
osmaniye.tarim.gov.tr
0(328) 914 11 75

Bu Program
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Eğitim Yayın ve Yayıncılık Dairesi Başkanlığı
koordinasyon ve desteği ile gerçekleştirilmektedir.



TARIMDA GENÇ GİRİŞİMCİ KADINLAR GÜÇLENİYOR



OSMANİYE 2017



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi
Proje No	6
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	3000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	1500
2017 Yılı Ödeneği (TL)	3000
Nakdi Gerçekleşme (%)	50
Fiziki Gerçekleşme (%)	50
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği eylem planı kapsamında; İlimizde Merkez ve İlçeler bazında her ay 16 adet yüzey suyu, göl akarsu ve baraj ile üç ayda bir olmak üzere 15 adet yer altı suyu izleme istasyonundan su numunesi alınmakta ve analizi yapılarak Nitrat Bilgi Sistemine (NİBİS) kaydı girilmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Merkez Ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi
Proje No	7
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım,
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	3344
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	--
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	3344
2017 Yılı Ödeneği (TL)	3344
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor.

Proje Özet Bilgisi

Ödenek miktarınca Müdürlük binalarımızda gerekli düzenlemeler yapıldı.
Tabelaların yenilenmesi, tamirat, tadilat işlemleri gerçekleştirildi.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Su Ürünleri Üretim Geliştirme Projesi
Proje No	8
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım, Hayvancılık
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	996
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	996
2017 Yılı Ödeneği (TL)	996
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Proje çerçevesinde baraj gölleri ve göletlerde balıklandırma, amatör balıkçı belgesi düzenleme, üretim ve satış yeri denetimleri ile av yasağı denetimleri gerçekleştirilmektedir.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi
Proje No	9
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	3000
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yılı İçerisinde Harcama (TL)	2.959
2017 Yılı Ödeneği (TL)	3000
Nakdi Gerçekleşme (%)	99
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde uygulanan projelerin takibi, yeni projelerde tespit ve hakedişlerin düzenlenmesi konularında faaliyetler yürütülüyor.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi (Çatak)
Proje No	10
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	7.597
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yılı İçi Harcama (TL)	7.597
2017 Yılı Ödeneği (TL)	7.597
Nakdi Gerçekleşme (%)	100
Fiziki Gerçekleşme (%)	99
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

İlimiz, Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/04/2015 tarih ve 29336 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Programına dahil edilmiş olup, İlimize tahsis edilen 2015, 2016 ve 2017 yılları için toplam 7.500 dekar alandan 4.450,485 dekarında çalışma yapılmıştır. Proje çerçevesinde damla sulama, taş toplama, çiftlik gübresi uygulaması, eğitim çalışmaları yer almaktadır.



Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller

Proje Adı	Arazi Topplulaştırma Ve Tigh Projesi
Proje No	11
Sektörü ve Alt Sektörü	Tarım
Proje Yeri (İlçe)	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	01.01.2017-31.12.2017
Proje Bedeli (TL)	37.348
Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	---
2017 Yıl İçi Harcama (TL)	34.830
2017 Yılı Ödeneği (TL)	37.348
Nakdi Gerçekleşme (%)	93
Fiziki Gerçekleşme (%)	90
Projenin Bugünkü Durumu	Devam ediyor

Proje Özet Bilgisi

İlimizde 49 Köyde arazi toplulaştırma çalışmasına fiili olarak başlanmış olup tespit, haritalandırma, yol yapımı gibi çalışmalar yürütülmektedir.





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ



ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



Yatırım Projeleri İzleme Raporu

EK-2

SIRA NO	YATIRIMCI KURULUŞ	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR	
									NAKİT HARC. (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)
1	Çevre ve Şehircilik İl Müd.	TARIM	1986A020020	Düziçi İlçe Gıda Tarım Müd.Hiz.Bin.Sondajlı Zemin Etüt Raporu Hazırlanması	Düziçi		16.000,00	16.000,00	13.499,20	100
2	Çevre ve Şehircilik İl Müd.	TARIM	1986A020020	Düziçi İlçe Gıda Tarım Müd.Hiz.Bin.Sitesi	Düziçi		33.000,00	2.733.000,00		
3	Çevre ve Şehircilik İl Müd.	KONUT	2017G000320	İl Jandarma Kamutanlığı 80 daireli lojman eütü proje hazırlanması	Osmaniye/ Merkez	-	10.000,00	10.000,00	-	
4	Çevre ve Şehircilik İl Müd.	D.K.H.	2012K160150	İşkur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi(E+P+i)	Osmaniye/ Merkez		1.000.000,00	3.000.000,00		
5	Çevre ve Şehircilik İl Müd.	D.K.H.	2017K090510	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	Osmaniye/ Merkez		2.000.000,00	9.771.000,00		
TOPLAM							3.059.000,00	15.530.000,00	13.499,20	
