



**OSMANIYE İLİNDE TAMAMLANAN,
YAPIMI DEVAM EDEN, İHALE VE PROJE
AŞAMASINDAKİ KAMU YATIRIMLARI**

TEMMUZ 2017



GENEL DEĞERLENDİRME



İlimizde **2017** yılı Temmuz ayı itibariyle toplam **428** adet proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Bu projelerin toplam bedeli **1 Milyar 638 Milyon 479 Bin TL** olup, 2017 yılında projelere ayrılan ödenek miktarı **347 Milyon 721 Bin TL**'dir. 2017 yılı dönem sonu itibariyle bu ödenekten **137 Milyon 777 Bin TL** harcama yapılarak **%39,6** oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.



GENEL DEĞERLENDİRME



2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle Yatırım Programında bulunan **428 adet projenin;**

- **141** adedi bitirilmiş,
- **101** adedinin yapımı devam etmekte,
- **22** adedi ihale aşamasında olup,
- **164** adedine ise başlanılamamıştır.



SEKTÖREL DEĞERLENDİRME



İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda bakıldığında ise; dönem içerisinde en büyük harcamaların, **%51,9'luk** pay ile **Ulaştırma Sektörü**, **%19,6'lık** pay ile **Eğitim Sektörü** ve **% 16,2'lik** pay ile **Tarım Sektörün** de olduğu belirlenmiştir.



T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ

DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

1. DÖNEMİ	: 2017 3. Dönem
2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü (Şube Müdürlüğü-ADANA)
3. TOPLAM PROJE SAYISI	: 22 Adet
4. PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	:
TARIM SEKTÖRÜ	: 22
ENERJİ SEKTÖRÜ	: -
HİZMET SEKTÖRÜ	: -
5. TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	: 225.817.221
6. ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	: 23.999.251
ÖNCEKİ YILLARDAN 2017'E DEVREDEN ÖDENEK 1 (TL)	: -
2017 YILINDA GÖNDERİLEN ÖDENEK 2 (TL)	: -
7. 2017 YILI SENE BAŞI ÖDENEĞİ 1+2 (TL)	: 26.947.229
8. 2017 YILI SENE SONU GERÇEKLEŞMESİ (TL)	: -
9. PARASAL GERÇEKLEŞME	: % 79,42
10. FİZİKİ GERÇEKLEŞME	: -
11. BİTEN PROJE SAYISI	: 2
12. DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 12
13. İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: 3
14. YARIM KALAN PROJE SAYISI	: -
15. BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI	: -
16. BAŞLANAMAMA NEDENİ	: İhale süreci devam ediyor.
17. 2016 YILINDA TAMAMLANAMAYARAK 2017 YILINA DEVREDEN PRJ.	:
18. ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	:
19. SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	:
20. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	:



TAŞKIN TESİSLERİ

	İŞ (Adet)	DERE (Adet)	FAYDASI	
			Alan (da)	Meskun Mahal (Adet)
Etüd ve Projesi Devam Eden	13	21	-	21
Etüd ve Projesi Tamamlanan	2	4	1 350	4
İnşaatı Devam Eden	13	13	5 450	13
İşletmede Olan	37	37	864 800	85
Toplam	54	64	871 600	123

**2017 YILI YATIRIM
PROGRAMINDA YER ALAN
BÜYÜK SU İŞLERİ PROJE YAPIMLARI**



TAŞKIN TESİSLERİ

Osmaniye İl genelinde

64 adet

taşkın koruma projesi ile;

871 600 dekar alan,

123 adet meskun mahal

taşkınlardan korunacaktır.

2017 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN BÜYÜK SU İŞLERİ PROJE YAPIMI

- ✓ **1 Adet Baraj**
- ✓ **2 Adet Sulama**
- ✓ **3 Adet** işin proje yapımı çalışmaları devam etmektedir.



2017 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN BÜYÜK SU İŞLERİ PROJE YAPIMI

BARAJ PROJE YAPIMI

1 Osmaniye Sabunsuyu Çatak Barajı Planlama ve Proje Yapımı



SULAMA PROJE YAPIMI

1 Osmaniye-Kadirli Savrun Barajı Sulaması Proje Yapımı

2 Aşağı Ceyhan Kesiksuyu Mehmetli Barajı I. ve II. Merhale Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı



OSMANİYE SABUNSUYU ÇATAK BARAJI PLANLAMA VE PROJE YAPIMI

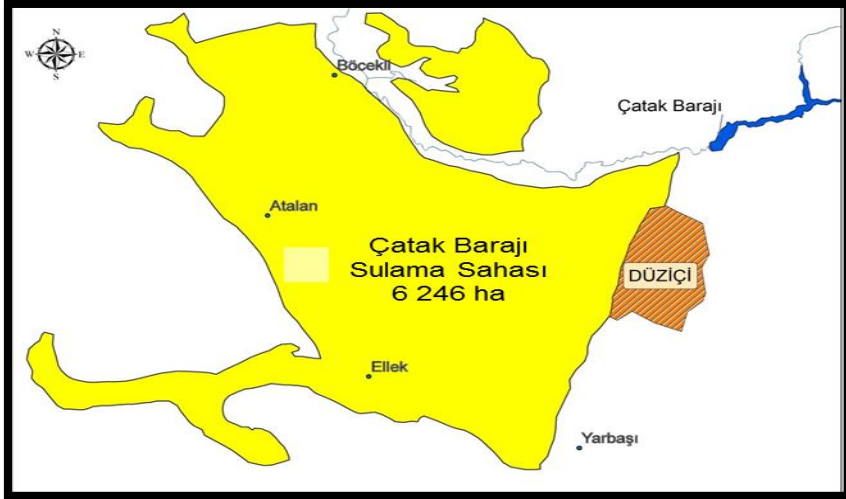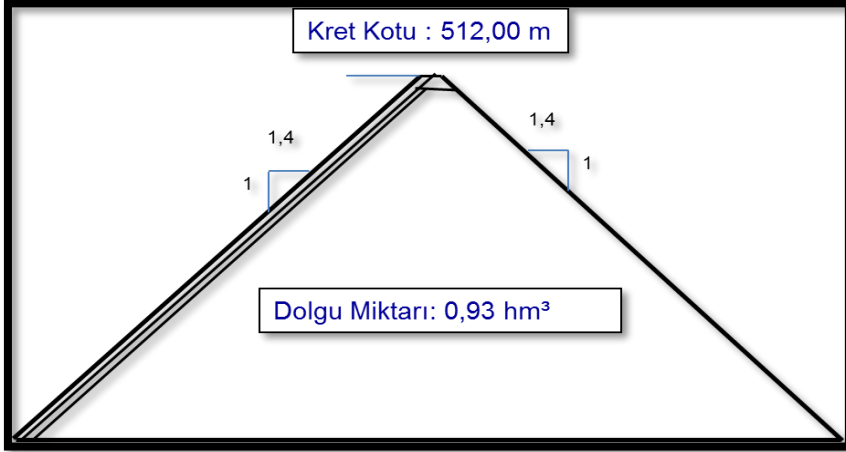

PROJE UYGULAMA DURUMU

Harita, hidroloji ve sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Planlama Ara Raporu onay için Genel Müdürlüğe gönderilmiştir.

PROJENİN YERİ

Osmaniye ili Düziçi ilçesi

PROJENİN MAKSADI

Sulama : 62 460 da
Enerji : 15,16 milyon kWh/yıl

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Gövde Tipi : Kil Çekirdekli
Gövde Hacmi : 0,93 hm³
Kret Kotu : 512,00 m
Depolama Hacmi : 87,00 milyon m³
Yükseklik (Temelden) : 116,50 m

MUKAVELE BİLGİLERİ


Danışman Firma : Temelsu Müh.
İhale Tarihi : 24.02.2015
Sözleşme Tarihi : 30.04.2015
İhale Bedeli : 1 650 000 TL
Başlama Tarihi : 08.05.2015
Bitiş Tarihi : 28.10.2016
2017 Yılı Ödeneği : 2 033 180 TL
2017 Yılı Harcaması : -
Fiziki Gerçekleşme : % 60



OSMANİYE-KADIRLI SAVRUN PROJESİ

OSMANİYE-KADIRLI SAVRUN BARAJI SULAMASI

PROJE YAPIMI

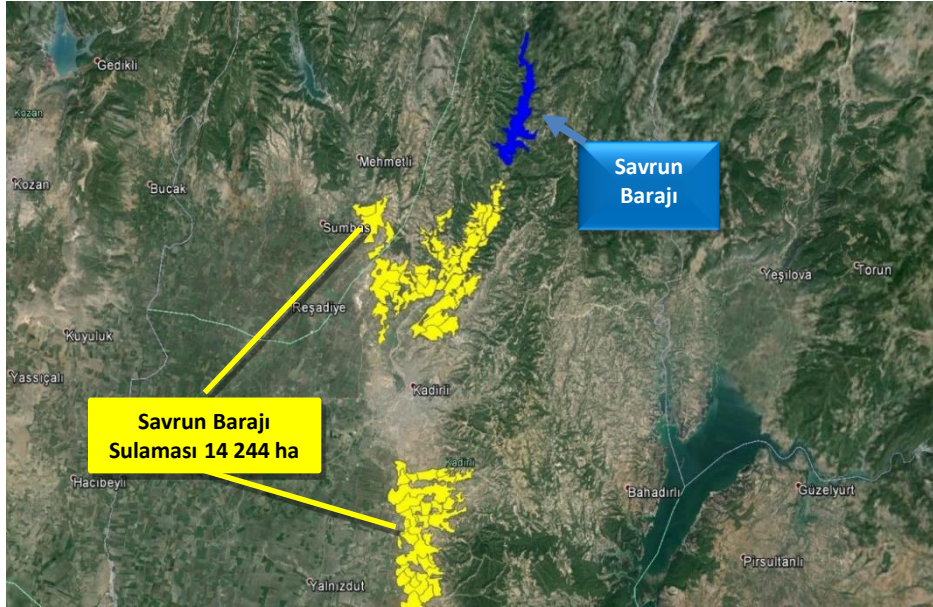

PROJE UYGULAMA DURUMU

Ön rapor onaylandı. Çalışmalar devam etmektedir.

PROJENİN YERİ

Osmaniye ili Kadırlı ilçesi

PROJENİN MAKSADI

Sulama Alanı : 142 440 da

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Şebeke Tipi : Borulu

MUKAVELE BİLGİLERİ

Danışman Firma : ER Müh. Ltd. Şti.

İhale Tarihi : 22.03.2016

Sözleşme Tarihi : 10.06.2016

İhale Bedeli : 597 000 TL

Başlama Tarihi : 20.06.2016

Bitiş Tarihi : 10.02.2018


2017 Yılı Ödeneği : 481 650 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşme : % 20



AŐAĐI CEYHAN KESİKSUYU MEHMETLİ BARAJI I. II. MERHALE SULAMALARI REHABİLİTASYONU PROJE YAPIMI

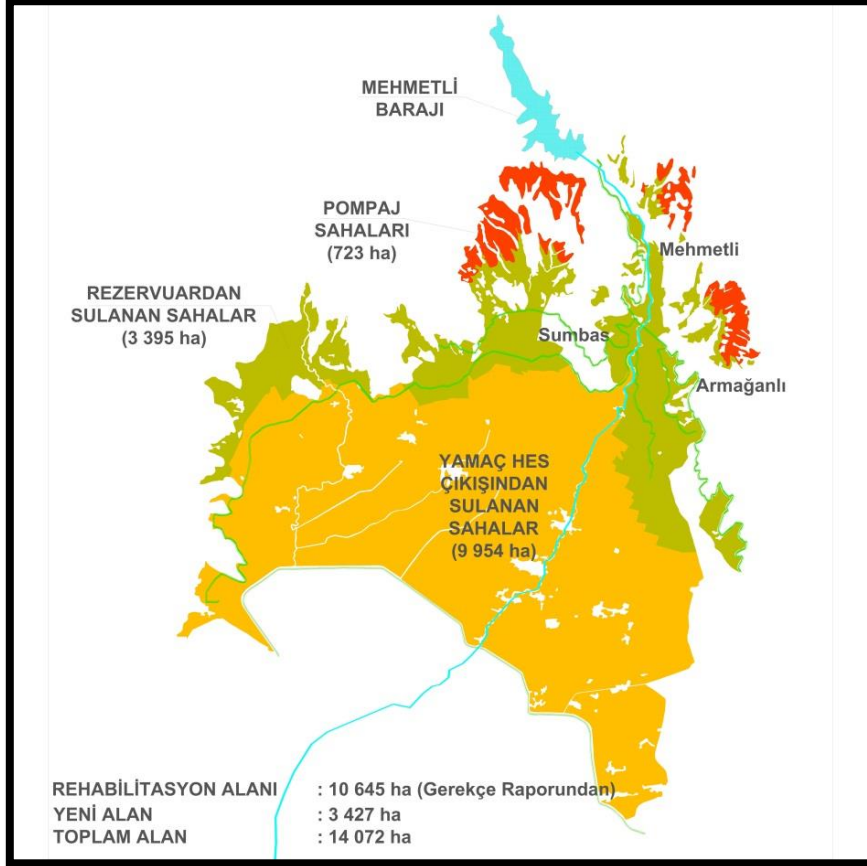

PROJE UYGULAMA DURUMU

Veri toplama çalışmalarını devam etmektedir.

PROJENİN YERİ

Osmaniye İli Kadirli İlçesi

PROJENİN MAKSADI

Sulama : 140 720 da

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Őebeke Tipi : Borulu

MUKAVELE BİLGİLERİ

Danışman Firma : Dolsar Müh.

İhale Tarihi : 15.06.2016

Sözleşme Tarihi : 19.08.2016

İhale Bedeli : 1 780 000 TL

Başlama Tarihi : 31.08.2016

Bitiş Tarihi : 24.11.2018

2017 Yılı Ödeneđi : 478 795 TL

2017 Yılı Harcaması : 189 430

Fiziki Gerçekleşme : % 20



**2017 YILI YATIRIM
PROGRAMINDA YER ALAN
BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ**

2017 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ

BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ



1 ADET BARAJ,
1 ADET RÖLEKASYON HATTI,
2 ADET SULAMA TESİSİ
1 ADET DÜZENLEME

1	OSMANİYE-KADIRLI SAVRUN PROJESİ Savrun Barajı
2	(TAMAMLAMA PROJESİ) MEHMETLİ BARAJI YÜKSELTİLMESİ PROJESİ Sumbas İlçesi İçmesuyu Rölekasyon Hattı
3	(TAMAMLAMA PROJESİ) AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ I. MERHALE PROJESİ AS0-BS0 İsale Kanallarının Yükseltilmesi
4	(TAMAMLAMA PROJESİ) AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ I. MERHALE PROJESİ AS0-BS0 İsale Kanallarının (Beton ve Korkulukları) Yenilenmesi 2.Kısım
5	(TAMAMLAMA PROJESİ) OSMANİYE CEVDETİYE REGÜLATÖRÜ - HAMİS ÇAYI MANSAP DÜZENLEMESİ (Osmaniye Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Cevdetiye Regülatörü Mansabına Taşınması İçin Deşarj Hattı Yapımı)



OSMANİYE-KADIRLI SAVRUN PROJESİ

SAVRUN BARAJI

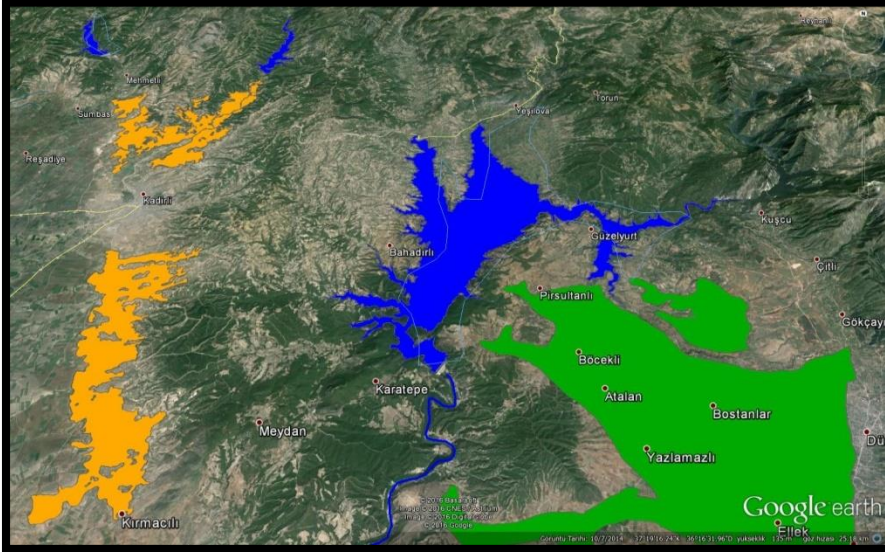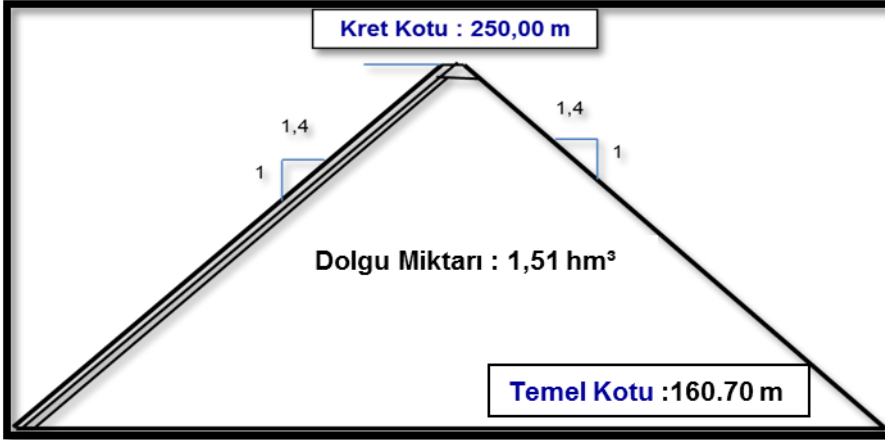

PROJE UYGULAMA DURUMU

26.05.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup çalışmalara başlanılacaktır.

PROJENİN YERİ

Osmaniye ili Kadirli ilçesi

PROJENİN MAKSADI

Sulama : 142 240 da
Enerji : 11,14 milyon kWh/yıl

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Gövde Tipi : Kil Çekirdekli
Gövde Hacmi : 1,51 hm³
Kret Kotu : 250,00 m
Depolama Hacmi : 93,45 milyon m³
Yükseklik (Temelden) : 89,39 m

MUKAVELE BİLGİLERİ

Müteahhidin Adı : Özaltın İnş.
İhale Tarihi : 19.01.2017
Sözleşme Tarihi : 26.05.2017
İhale Bedeli : 73.553.250
Başlama Tarihi : 21.06.2017
Bitiş Tarihi : 31.05.2021
2017 Yılı Ödeneği : 1 400 000 TL
2017 Yılı Harcaması : -
Fiziki Gerçekleşme : -



MEHMETLİ BARAJI YÜKSELTİLMESİ PROJESİ

SUMBAS İLÇESİ İÇMESUYU RÖLEKASYON HATTI



PROJE UYGULAMA DURUMU

Montajı yapılan boruların testi dışında iş tamamlanmıştır.

PROJENİN YERİ

Osmaniye İli Sumbas İlçesi sınırları içerisinde.

PROJENİN MAKSADI

Mehmetli barajının yükseltilmesi sonucu baraj gölü içerisinde kalan Gaffarlı köyünün içmesuyu hattının rölestasyonudur.

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

İsale Hattı : 3 000 m

MUKAVELE BİLGİLERİ

Müteahhidin Adı : İsmail Ertunç Müh.

İhale Tarihi : 01.09.2016

Sözleşme Tarihi : 28.09.2016

İhale Bedeli : 851 070 TL

Başlama Tarihi : 06.10.2016

Bitiş Tarihi : 01.08.2017

2017 Yılı Ödeneği : 417 000 TL

2017 Yılı Harcaması : 416 966 TL

Fiziki Gerçekleşme : % 100



AŐAĐI CEYHAN ASLANTAŐ I.MERHALE PROJESİ (TAMAMLAMA) ASO-BSO İSALE KANALLARININ YÜKSELTİLMESİ



PROJE UYGULAMA DURUMU

06.02.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

PROJENİN YERİ

Osmaniye Merkez

PROJENİN MAKSADI

BSO İsale kanalında Km:0+000 ile Km:23+000 arasında 18 470 m Trapez, 4 530 m duvarlı beton kanal yükseltilmesi yapılacaktır.

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

İsale Hattı : 4 530 m

MUKAVELE BİLGİLERİ

Müteahhidin Adı : İsmail Ertunç + Şen-Yıl Yapı

İhale Tarihi : 09.11.2016

Sözleşme Tarihi : 06.02.2017

İhale Bedeli : 5 297 547 TL

Başlama Tarihi : 15.02.2017

Bitiş Tarihi : 11.01.2018

2017 Yılı Ödeneđi : 850 000 TL

2017 Yılı Harcaması : 848 634 TL

Fiziki Gerçekleşme : 13



AŐAĐI CEYHAN ASLANTAŐ I. MERHALE PROJESİ

ASO-BSO İSALE KANALLARI YÜKSELTİLMESİ 2. KISIM



PROJE UYGULAMA DURUMU

İhalesinin 2017 yılı Ağustos ayında yapılması planlanmaktadır.

PROJENİN YERİ

Osmaniye Merkez

PROJENİN MAKSADI

BSO İsale kanalında Km:0+000 ile Km:23+000 arasında 18470 m Trapez, 4530 m duvarlı beton kanal yükseltilmesi yapılacaktır.

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

İsale Hattı :

MUKAVELE BİLGİLERİ

Müteahhidin Adı :

İhale Tarihi :

Sözleşme Tarihi :

İhale Bedeli :

Başlama Tarihi :

Bitiş Tarihi :

2017 Yılı Ödeneđi : 700 000 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşme :



**OSMANİYE CEVDETİYE REGÜLATÖRÜ-HAMİS ÇAYI MANSAP DÜZENLEMESİ
(OSMANİYE BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SULARININ
CEVDETİYE REGÜLATÖRÜ MANSABINA TAŞINMASI İÇİN DEŞARJ
HATTI YAPIMI)**



PROJE UYGULAMA DURUMU

Sözleşmesi 08.06.2017 tarihinde yapılarak
16.06.2017 tarihinde işe başlanılmıştır.

PROJENİN YERİ

Osmaniye Merkez ilçeleri

PROJENİN MAKSADI

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

:

MUKAVELE BİLGİLERİ

Müteahhidin Adı	:	Fikret Çetin İnş.
İhale Tarihi	:	04.04.2017
Sözleşme Tarihi	:	08.06.2017
İhale Bedeli	:	6 617 393
Başlama Tarihi	:	16.06.2017
Bitiş Tarihi	:	01.08.2017
2017 Yılı Ödeneği	:	750 000 TL
2017 Yılı Harcaması	:	
Fiziki Gerçekleşme	:	



**2017 YILI YATIRIM
PROGRAMINDA YER ALAN
KÜÇÜK SU İŞLERİ**



KÜÇÜKSU İŞLERİ PROJELERİ

2 ADET GÖLET VE
SULAMASI İNŞAATI

7 ADET TAŞKIN KORUMA

4 ADET TAŞKIN VE
RUSUBAT KONTROLÜ

GÖLET VE SULAMALARI

1 Osmaniye-Kadirli Oruçbey Göleti

2 Osmaniye-Bahçe İnderesi Göleti

TAŞKIN KORUMA

1 Osmaniye-Kadirli İncehalik, Aktaş ve Domuzdağı Dereleri

2 Osmaniye- Merkez Karaçay Deresi 3. Kısım

3 Osmaniye-Merkez Karacaören Kuşaklama Kanalı 2. Kısım

4 Osmaniye-Bahçe İlçesi Aslanlı Deresi Islahı

5 Osmaniye-Merkez Karaçay Deresi Üzerine Köprü Yapımı

6 Osmaniye-Bahçe Yerleşim Alanın Koca Bekdemir (Bilalik), Harami ve Kar Dereleri 2. Kısım

7 Osmaniye Kadirli İlçesi Savrun Çayı 3. Kısım

TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ

1 Osmaniye-Düziçi Atalan Deresi Islahı

2 Osmaniye-Bahçe İlçe Merkezi Horu Çayı

3 Osmaniye-Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü İçerisinden Geçen Derelerin Islahı 1. Kısım (Yıldızlar – Oğmaca – Keklik - Mamo)

4 Osmaniye-Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü İçerisinden Geçen Derelerin Islahı 2. Kısım (Kurtgölü - Koca - Ağdere – Çığıranlı – Tedirli - Kirazlı)



GÖLET VE SULAMALARIN İCMALİ (3 Adet)

	TAMAMLANAN (1 Adet)	
1	Osmaniye-Düziçi Karacaören Göleti ve Sulaması	1071 Gölet Projesi
	PROJE AŞAMASINDA (1 Adet)	
1	Osmaniye-Kadirli Oruçbey Göleti	1071 Gölet Projesi
	PLANLAMA AŞAMASINDA (1 Adet)	
1	Osmaniye-Bahçe İnderesi Göleti	1071 Gölet Projesi
	GENEL TOPLAM 3 ADET	



OSMANİYE DÜZİÇİ KARACAÖREN GÖLETİ VE SULAMASI



PROJE UYGULAMA DURUMU

Gölet tamamlandı. Sulama şebekesi çalışmaları devam etmektedir.

PROJENİN YERİ

Osmaniye ili Düziçi ilçesi

PROJENİN MAKSADI

Sulama : 810 da

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Gövde Tipi : Zonlu Toprak Dolgu

Gövde Hacmi : 0,32 hm³

Kret Kotu : 614,20 m

Depolama Hacmi : 0,50 hm³

Yükseklik (Temelden) : 39,00 m

MUKAVELE BİLGİLERİ

Müteahhidin Adı : Umut Yapı

İhale Tarihi : 08.02.2013

Sözleşme Tarihi : 26.06.2013

İhale Bedeli : 5 627 021 TL

Başlama Tarihi : 05.07.2013

Bitiş Tarihi : 02.02.2017


2017 Yılı Ödeneği : 559 000 TL

2017 Yılı Harcaması : 558 497

Fiziki Gerçekleşme : % 99



OSMANIYE-KADIRLI ORUÇBEY GÖLETİ VE SULAMASI

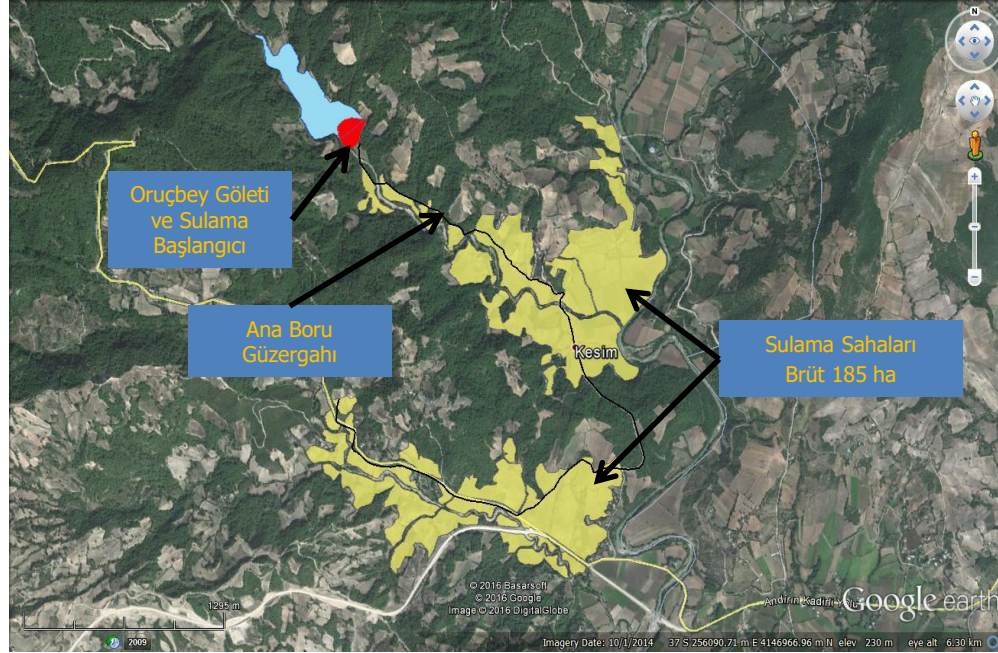

PROJE UYGULAMA DURUMU

İhalesinin 2017 yılı Kasım ayında yapılması planlanmaktadır.

PROJENİN YERİ

Adana ili Kadırlı ilçesi

PROJENİN MAKSADI

Sulama : 1 850 da

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Gövde Tipi :

Gövde Hacmi :

Kret Kotu :

Depolama Hacmi : 1,00 hm³

Yükseklik (Temelden) : 31,00 m

MUKAVELE BİLGİLERİ

Müteahhidin Adı :

İhale Tarihi :

Sözleşme Tarihi :

İhale Bedeli :

Başlama Tarihi :

Bitiş Tarihi :


2017 Yılı Ödeneği : 500 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşme : -



OSMANIYE-BAHÇE İNDERESİ GÖLETİ

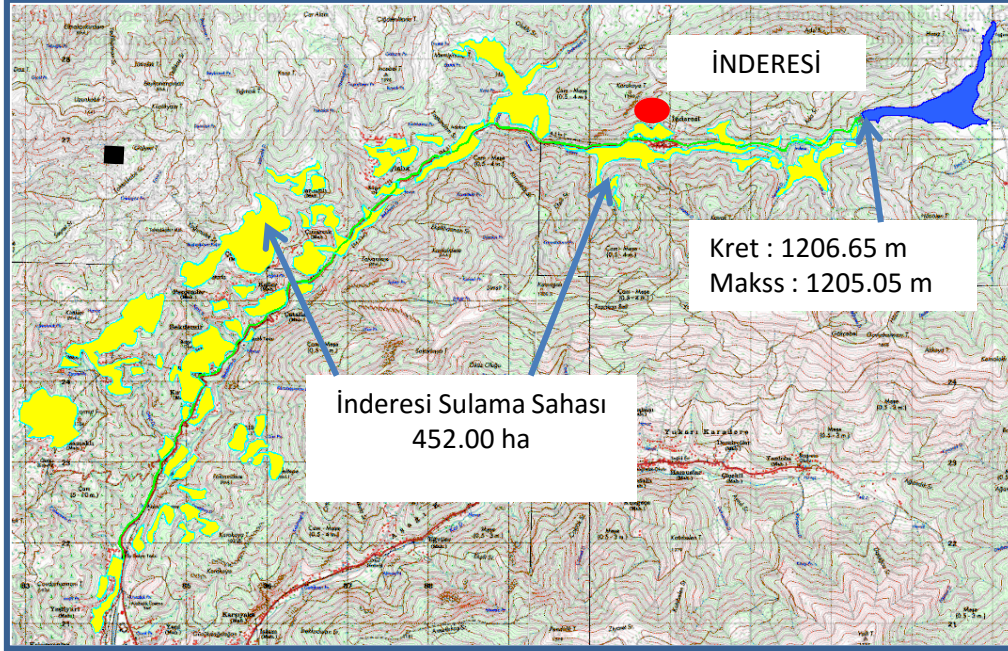

PROJE UYGULAMA DURUMU

İhalesinin 2017 yılı Aralık ayında yapılması planlanmaktadır.

PROJENİN YERİ

Adana ili Bahçe ilçesi

PROJENİN MAKSADI

Sulama : 4 520 da

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Gövde Tipi :

Gövde Hacmi :

Kret Kotu :

Depolama Hacmi : 1 206,65 m

Yükseklik (Temelden) : 26,25 m

MUKAVELE BİLGİLERİ

Müteahhidin Adı :

İhale Tarihi :

Sözleşme Tarihi :

İhale Bedeli :

Başlama Tarihi :

Bitiş Tarihi :

2017 Yılı Ödeneği : 480 000 TL

2017 Yılı Harcaması : -

Fiziki Gerçekleşme : -



**2017 YILI YATIRIM PROGRAMINDA
YER ALAN TAŞKIN KORUMA VE
TAŞKIN RUSUBAT KONTROL İŞLERİ**



YAPIMI DEVAM EDEN TAŞKIN KORUMA VE TAŞKIN RUSUBAT KONTROLU İNŞAATLARI

Sıra No	İŞİN ADI	Proje Tutarı (TL)	Sene Başı Ödenek	Revize Ödenek	Harcama	Sözleşme Tarihi	İş İkmal Tarihi	Taşkın Fayda (ha)	Fiziki Gerç. (%)	Yapılan İşin Durumu
YAPIMI DEVAM EDEN TAŞKIN KORUMA İNŞAATLARI										
1	Osmaniye-Kadirli İncehalık, Aktaş ve Domuzdağı Dereleri	13 558 000	1 210 000	1 653 000	3 296 000	22.04.2016	18.08.2018	1 ilçe	24	Çalışmalar devam etmektedir.
2	Osmaniye- Merkez Karaçay Deresi 3. Kısım	9 067 260	1 000 000	2 522 000		13.06.2016	21.12.2017	1 il	41	İş yeri teslimi yapıldı. Uygulama projeleri yapılıyor.
3	Osmaniye-Merkez Karacaören Kuşaklama Kanalı 2. Kısım	6 477 000	530 000	953 000	952 209	16.11.2015	15.06.2017	1 mah.	96	4 482 metre pere kaplama çalışmasının 3 600 m'lik kısmı tamamlanmıştır. Çalışmaları devam etmektedir.
4	Osmaniye-Bahçe İlçesi Aslanlı Deresi Islahı	5 277 118	850 000	2 284 000	2 283 109	10.08.2016	21.09.2017	1 ilçe	53	Çalışmalar devam etmektedir.
5	Osmaniye-Merkez Karaçay Deresi Üzerine Köprü Yapımı	1 873 759	300 000	300 000	-	01.12.2016	07.10.2017	Ulaşım		Sözleşme imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
6	Osmaniye-Bahçe Yerleşim Alanının Koca Bekdemir (Bilalilik), Harami ve Kar Dereleri 2. Kısım		500	500						İhalesi 2017 Eylül ayında yapılması planlanmaktadır.
7	Osmaniye Kadirli İlçesi Savrun Çayı 3. Kısım		500	500						İhalesi 2017 Kasım ayında yapılması planlanmaktadır.



YAPIMI DEVAM EDEN TAŞKIN KORUMA VE TAŞKIN RUSUBAT KONTROLU İNŞAATLARI

Sıra No	İŞİN ADI	Proje Tutarı (TL)	Sene Başı Ödenek	Revize Ödenek	Harcama	Sözleşme Tarihi	İş İkmal Tarihi	Taşkın Fayda (ha)	Fiziki Gerç. (%)	Yapılan İşin Durumu
YAPIMI DEVAM EDEN TAŞKIN RUSUBAT KONTROLU İNŞAATLARI										
1	Osmaniye-Düziçi Atalan Deresi Islahı	7166 000	565 899	565 899		18.09.2015	23.03.2017	1 ilçe	91	5394 m kagir duvar, 2 967 m ² pere kaplama ve 6 756 m korkuluk ve 51 adet şut yapısı imalatları yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
2	Osmaniye-Bahçe İlçe Merkezi Horu Çayı	12 701 000	1 150 000	2 726 000	3 639 254	23.12.2016	18.05.2017	1 ilçe	29	TEMİM Müh.+ NACAR İnş. ile sözleşme imzalanarak işe başlanılmış olup, Mahkeme kararı ile KİK'ten düzeltici işlem yapılmasını istendiğinden ihale Komisyonunca yeniden karar alınarak, ISPARTAKULE Yapı Mehmet AKSEKİLİ + BERFA İnş. Turan KOÇER (İş Ort.) ile yeniden sözleşme imzalanmıştır.
3	Osmaniye-Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü İçerisinden Geçen Derelerin Islahı 1. Kısım (Yıldızlar – Oğmaca – Keklik - Mamo)	7 147 000	1 188 000	3 433 000	3 432 197	10.08.2016	21.09.2017	1 ilçe	63	İşe başlanılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
4	Osmaniye-Düziçi Ellek Beldesi ve Yazlamazlı Köyü İçerisinden Geçen Derelerin Islahı 2. Kısım (Kurtgözü - Koca - Ağdere – Çığırğanlı – Tedirli - Kirazlı)	5 287 000	900 000	2 318 000	2 317 335	26.09.2016	03.11.2017	1 ilçe	53	Sözleşme imzalanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.



OSMANIYE-BAHÇE İLÇESİ KOCADERE BEKDEMİR (BİLALİK) HARAMİ VE KAR DERESİ



OSMANIYE DÜZİÇİ ATALAN DERESİ ISLAHI



TAŞKIN TESİSLERİ

İSTİKŞAF RAPORU DEVAM EDEN TAŞKIN KORUMA VE TAŞKIN RUSUBAT KONTROL İŞLERİ

Sıra No	PROJE ADI	ISLAH UZUNLUĞU (m)	İlçesi
1	Hasanbeyli İlçesi <u>Almanpınarı, Mescit Ve Küçükdere Derelerinin</u> Taşkın Koruma Planlama Raporu.	4000	Hasanbeyli
2	Merkez İlçe, <u>Çona (Hacıgüllü) Deresi</u> Taşkın Koruma Planlama Raporu.	4500	Merkez



T.C.
Osmaniye Valiliği

KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU: KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI	8	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	431.902.000	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2016 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	19.793.000
	2016 YILI İÇ KREDİ TUTARI	
	2016 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	
	2016 YILI ÖZKAYNAK	
	2016 YILI HİBE	
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	19.793.000	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	43.274.282	
2017 YIL İÇİ HARCAMA	17.686.451	
TOPLAM HARCAMA	60.960.733	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	89	

KURUMU: KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

6

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

2

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

TAMAMLANAN PROJE SAYISI


TOPLAM

8



SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	2017 PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR	PROJ. DURUMU
						NAKİT HARC. (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)		
1	Kadirli-Andırın 2+000-41+183	Osmaniye-K.maraş		2.000.000	24.000.000		12	Toplam 39,2 km uzunluğundaki yolun 19 km'si Osmaniye il sınırında olup TY-SK standardındadır. 2016 yılı sonu itibarıyla 35,4 km'si (önceki ihaleler kapsamında) tamamlanmıştır. Km:16+000-16+100 arasında meydana gelen heyelan için ve kalan 3,8 Km'nin tamamlanması için, İkmal ihalesi yapılmış olup 09.02.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. 2017 yılında heyelan için hazırlanan geoteknik proje doğrultusunda, sanat yapıları ve toprak işlerinde çalışılmaktadır.	Devam Eden
2	Kadirli-Sumbas Yolu Km:0+000-9+661 Arası	Osmaniye		2.000	14.500.000		0	Toplam 9,7 km uzunluğundaki yolun 6 km BY-SK , 3,7 km si TY-SK ' dir. Yolda 29.05.2012 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Kamulaştırma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup 2017 yılında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmaya başlanmıştır. Projede 1 adet 30 metre tek köprü bulunmaktadır.	Devam Eden
3	Osmaniye-Nurdağı Yolu (BSK İşi) (Km:15+000-52+126)	Osmaniye-G.antep	3.140.000	1.000.000	60.700.000	4.231.000	13	Toplam 37,1 km uzunluğundaki yolun 29,4 km'si Osmaniye ili sınırlarındadır. Bu ihale kapsamında 27 km BY-BSK ve 10,1 km BSK onarım yapılacaktır. 2016 yılı sonu itibarıyla yolun muhtelif kesimlerindeki toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılmıştır. 2017 yılında 7 km BY-BSK (2,1 km Osmaniye il sınırlarında) yapılması hedeflenmektedir.	Devam Eden
4	Osmaniye-Liman Bağlantısı (Km:0+000-11+615)	Osmaniye	28.230.000	8.000.000	41.600.000	2.000.000	77	Toplam 11,6 km uzunluğunda BY standardındaki yolda 03.09.2015 tarihinde yapım çalışmalarına başlanmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla 7,6 km BY-BSK ve 38 metre ve 44 metre uzunluğunda 2 adet çift köprü (Sukemeri Köprüsü, Otoyol Bağlantı Köprüsü) tamamlanmıştır. 2017 yılında 4 km BY-BSK, 52 metre uzunluğunda 1 adet çiftköprü (Burnaz Köprüsü) tamamlanması hedeflenmektedir.	Devam Eden
5	Ceyhan-Çukurköprü-Kozan Devlet Yolu	Osmaniye Adana	4.090.000		116.400.000		4	Toplam 72 km uzunluğundaki yolun 16 km' si Osmaniye ili sınırlarındadır. İlk projesinde 10 Km BY-62 Km TY iken 06.01.2017 tarihli Ön Değerlendirme Olur'u ile Ceyhan-Çukurköprü arası 36 km 'lik kesimin tamamı BY standardına dönüştürülmüş olup, yolun önceki ihaleler kapsamında 18,8 Km'lik (2,6 BY-16,2 TY) kesimi SK seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Bu ihale bünyesinde yolun tamamının BSK'lı olarak yapılması ve 4 adet köprü yapılması planlanmaktadır. 14.12.2015 tarihinde çalışmalara başlanmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla 1 adet (48 m) çift köprü, 1 adet (42 m) tek köprü yapılmıştır. 2017 yılında 3 km BY-BSK yapılması hedeflenmiştir.BY projesi tamamlanan kesimler için Kamulaştırma Planı üretimi çalışmalarına başlanmıştır. Güzergahta Tedaş, Teiaş, Aski ve Telekom'a ait tesislerin deplase edilmesi gerekmektedir.	Devam Eden
6	TARSUS-G.ANTEP ve TOPRAKKALE-İSKENDERUN OTOYOLUNDA MUHT. KESİMLERİN ÜSTYAPI ONARIMI YAPIM İŞİ	Osmaniye	7.814.282	7.491.000	37.702.000	2.614.839	28	Toplam 23 km uzunluğunda 2X3 standardındaki yolun (BSK yenileme çalışmaları için) 14,1 km'si Osmaniye sınırlarındadır. 2016 yılı sonu itibarıyla toplam 8 km (3,6 km Osmaniye ilinde) BSK yenileme işi tamamlanmıştır. 2017 yılında 8 km (5,5 km Osmaniye ilinde) tamamlanması hedeflenmektedir. 2017 yılında 2,49 km (1,155 km'si Osmaniye)'si tamamlanmıştır.	Devam Eden
7	Toprakkale-Osmaniye Devlet Yolunun 80-50 K.K no'lu Toprakkale İy.Ayr.-Osmaniye Çevre Yolu arası BY-BSK ONR.	Osmaniye			57.500.000			Toprakkale- Osmaniye Çevre Yolu arası toplam 12,7 km uzunluğundaki kesim mevcutta BY-BSK olup bu ihale bünyesinde BSK onarım çalışmaları yapılacaktır. Bu kesimin 09.05.2017 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir.	İhale Sürecinde
8	KADIRLI- OSMANİYE YOLU	Osmaniye		1.300.000	79.500.000			Toplam 45.6 Km uzunluğunda olan yolda, ihale kapsamında Kadirli- Sumbas Yolunda 1 Km TY-SK>BSK, Kozan-Kadirli Yolunda 3 Km BY-BSK ONR., Kadirli-Osmaniye Yolunda 36,3 Km TY-SK>BSK, 3,8 Km BY-SK>BSK, 1.5 Km BY-BSK ONR. yapılması planlanmaktadır. Bu işin 03.08.2017 tarihinde bölge müdürlüğümüzce ihalesi yapılacaktır.	İhale Sürecinde
DİĞER HARCAMALAR (KAMULAŞTIRMA, ETÜT PROJE, TRAFİK GÜVENLİĞİ ve BAKIM ONARIMLAR)						8.840.612			
T O P L A M			43.274.282	19.793.000	431.902.000	17.686.451			

Yatırımlarla İlgili Görseller

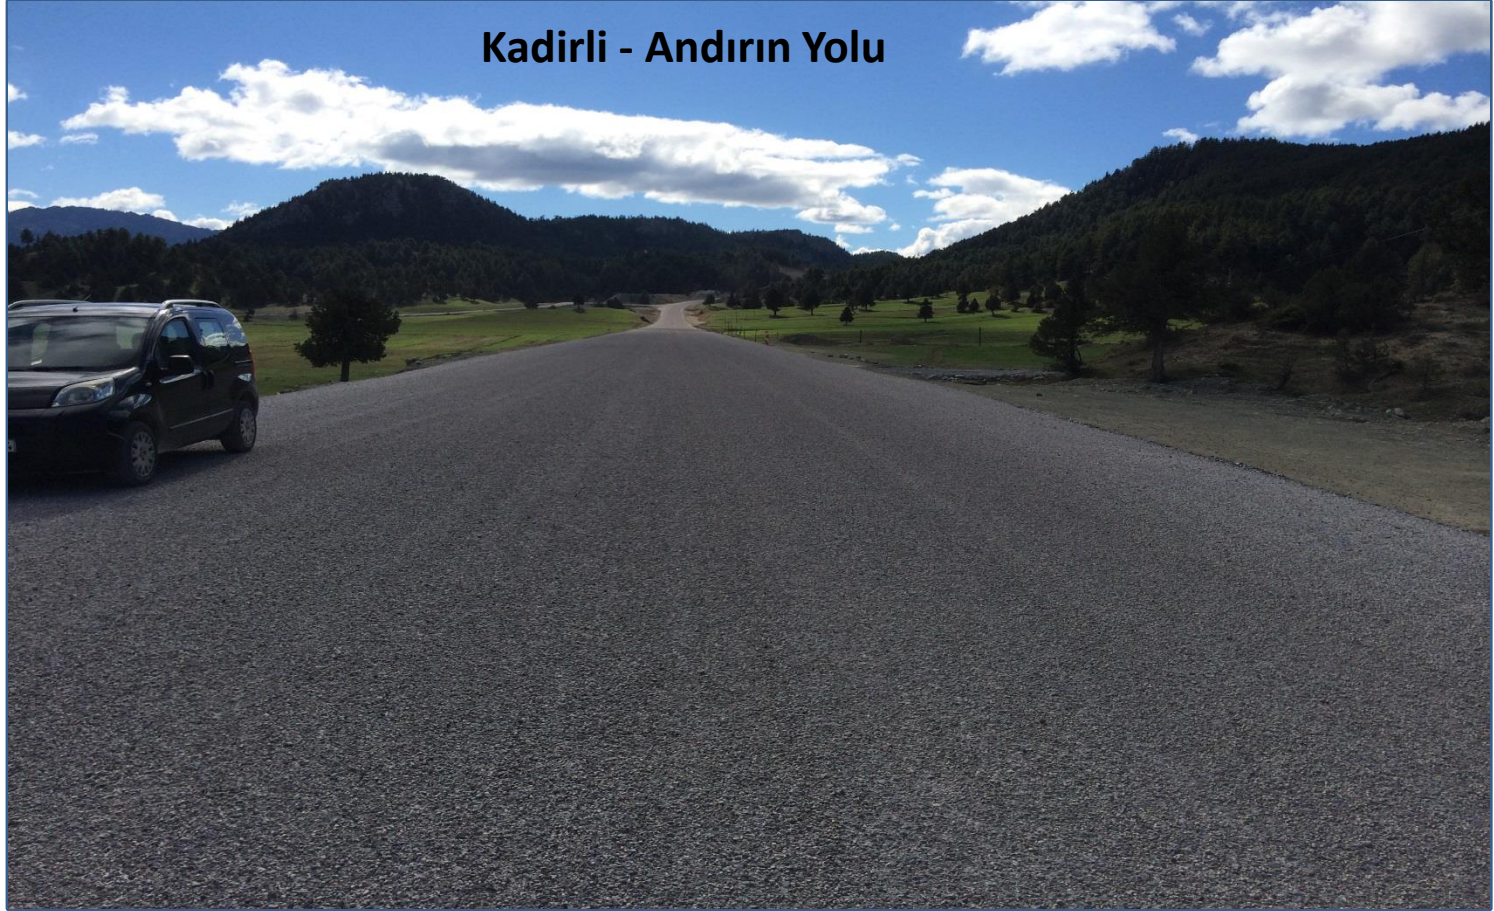

Yatırımlarla İlgili Görseller



T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ

İL BANK A.Ş.
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1.	DÖNEMİ	:	2017 / 3. Dönem
2.	YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	:	İLBANK A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü
3.	TOPLAM PROJE SAYISI	:	1 Adet
4.	PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI		
	<i>Kanalizasyon Sektörü</i>	:	1 Adet
5.	TOPLAM PROJE TUTARI (TL)	:	11.773.280,45
6.	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	:	7.922.137,45
7.	2017 YILI ÖDENEĞİ (TL)	:	3.788.183,40
8.	DÖNEM SONUNA KADAR HARCAMA (TL)	:	3.788.183,40
9.	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) (Dönem itibariyle)	:	% 100
10.	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) (Devam eden ve biten işler)	:	% 100
11.	BİTEN PROJE SAYISI	:	1 Adet
12.	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	:	-
13.	İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	:	-
14.	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	:	-
15.	BAŞLANMAMA NEDENLERİ	:	-
16.	2016 YILINDA TAMAMLANAMAYARAK 2017 YILINA DEVREDEN PROJE SAYISI	:	1 Adet
17.	ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	:	-
18.	SORUN VE DARBOĞAZLARIN NEDENLERİ	:	-
19.	ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	:	-

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

-

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

-

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

-

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

1 Adet

TOPLAM

1 Adet



KURUMU: İLBANK A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	PROJE BEDELİ (TL)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (%)
1	ATALAN-ELLEK-YARBAŞI Kanalizasyon İnşaatı	DÜZİÇİ	7.922.137,45	3.788.183,40	11.773.280,45	3.788.183,40	100	100
1	TOPLAM		7.922.137,45	3.788.183,40	11.773.280,45	3.788.183,40	100	100

NOT: Bu işlerimizin dışında Bölge Müdürlüğümüzün JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) kredisi kapsamında Osmaniye Belediyesi ile birlikte üzerinde çalıştığı projelerden **Osmaniye (Akyar Mahallesi) Kanalizasyon, Kadirli Atıksu Arıtma Tesisi ve Osmaniye Terfi Merkezi ve Terfi Hattı İnşaatı** Belediyesince ihale edilmiştir. Bu işlerden; **Osmaniye (Akyar Mahallesi) Kanalizasyon ve Kadirli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı** Belediyesince alınan kararla feshedilmiş olup, **Osmaniye (Akyar Mahallesi) Kanalizasyon ikmal inşaatı** yeniden ihale edilerek çalışmalara başlanmıştır. **Kadirli Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı** ihale öncesi çalışmalarını devam ettirmektedir. **Osmaniye Terfi Merkezi ve Terfi Hattı İnşaatında** çalışmalar devam etmektedir.





İL BANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

ATALAN – ELLEK – YARBAŞI KANALİZASYON İNŞAATI





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU:ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI	6	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	5.613.000	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	5.613.000
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	0
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	0
	2017 YILI ÖZKAYNAK	0
	2017 YILI HİBE	0
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	5.613.000	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	0	
2017 YIL İÇİ HARCAMA	704.957	
TOPLAM HARCAMA	704.957	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	13	



KURUMU:ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI	6
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	0
BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI	0
TAMAMLANAN PROJE SAYISI	0
TOPLAM	6



KURUMU:ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (%)
1	ORMAN KADASTRO	Muhtelif İlçeler	0	100.000	100.000	19.624	3	20
2	ORMAN KÖYLERİ ETÜT PLANLAMA	Muhtelif İlçeler	0	15.000	15.000	5.000	30	33
3	ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE	Muhtelif İlçeler	0	1.615.000	1.615.000	14.680	85	1
4	AĞAÇLANDIRMA VE TOPRAK MUHAFAZA	Muhtelif İlçeler	0	2.708.000	2.708.000	351.510	98	13
5	ORMAN İŞLETMECİLİK	Muhtelif İlçeler	0	931.000	931.000	272.743	105	29
6	FİDAN ÜRETİM	Muhtelif İlçeler	0	244.000	244.000	41.400	40	17



ÜRETİM FAALİYETLERİ

2017 Mayıs ayı sonu itibariyle üretim faaliyetlerinde **207.865 m3** Endüstriyel Odun, **47.306 Ster** Yakacak odun üretimi yapılmış ve orman köylülerine **2.895.507 TL** ödeme yapılmıştır.



ORKÖY FAALİYETLERİ

2017 yılı içinde **83** aileye **877.375 TL** kredi ve **219.344 TL** hibe desteği sağlanmıştır. **3** aileye **42.000 TL** Fenni arıcılık, **32** aileye **606.397 TL** Süt sığırcılığı , **15** aileye **388.921 TL** Süt koyunculugu kredi ve hibe dağıtımı yapılmıştır.



AĐAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ

Ađaçlandırma, Rehabilitasyon ve Toprak Muhafaza ile ilgili Tesis yapım faaliyetleri kapsamında 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar **1.082** Ha. Programa karşılık **385** ha. Gerçekleşme sağlanmıştır. Ađaçlandırma bakım faaliyetlerinden **650** ha programa karşılık **386** ha. gerçekleşme sağlanmıştır.



AĐAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ

2017 yılı için Rehabilitasyon tesis faaliyeti olarak **332** ha, Rehabilitasyon bakım faaliyetlerinden **400,0** ha, Erozyon Kontrol çalıřmaları kapsamında **500** Ha, erozyon kontrolü bakım faaliyetlerinden **1.100,0** ha, etüt proje faaliyetlerinden **800,0** ha programa alınmıřtır.




AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ

2017 yılı için Rehabilitasyon bakım faaliyetlerinden **125,0** ha, Erozyon Kontrol çalışmaları kapsamında **250,0** ha, erozyon kontrolü bakım faaliyetlerinden **1.100,0** ha, etüt proje faaliyetlerinden **800,0** ha program uygulaması tamamlanmıştır. Arazi üzerindeki faaliyetler devam etmektedir.



GELİR GETİRİCİ TÜRLERDE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Bu güne kadar, Badem Eylem Planı kapsamında **5 ha.** Alanda **6.800** adet, Ceviz Eylem Planı kapsamında **13 ha.** alanda **7.500** adet, Dut Eylem Planı kapsamında **96 ha.** alanda **41.400** adet fidan toprakla buluşturulmuştur.



OKULLAR HAYAT OLSUN, İBADETHANE VE MEZARLIKLAR AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Okullar Hayat Olsun etkinliđi kapsamında 2017 yılı içinde 5 adet Okul Bahçesi, ağaçlandırılmıştır.



ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar 17 Adet orman yangını çıkmış 6,99 Ha. Alan yanmıştır.



YARDOP PROJESİ UYGULAMALARI

2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar 15 Km YARDOP çalışması tamamlanmıştır.



ORMAN YOLLARI YAPIMI FAALİYETLERİ

Yatırım faaliyetleri kapsamında 2017 yılında **32 km.** Aplikasyon , **19 km.** Yeni Orman Yolu ve **15 km.** büyük onarım çalışmaları, **15 km** Sanat Yapısı programa alınmış ve mayıs ayı sonu itibarıyla tamamı gerçekleştirilmiştir. Üretim Yolları tamir bakımı faaliyetlerinden **370 Km.** tamamlanmış **119.597 TL .** harcama yapılmıştır.



ORMAN KADASTRO FAALİYETLERİ

2017 yılında Osmaniye illinde **17** birimde kadastro çalışma programımız bulunmaktadır. Bu programın iş dağılımı şöyledir;

10 birimde 6831 sayılı kanuna göre orman kadastro çalışması,2 birimde ise 6831 sayılı orman kadastrolarına göre orman kadastro ve aynı kanunda 3302 sayılı kanunla değişik 2/b madde çalışması yapılacaktır. Ayrıca 5 birimde daha öncesinde 3402 sayılı kadastro kanununa göre orman kadastro yapılmış olup 6831 sayılı kanunda 3302 sayılı kanunla değişik 2/b madde çalışması yapılması planlanmıştır. Şimdiye kadar 2 birimde çalışmalar tamamlanarak ilanı yapılmıştır.



ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

2017 Yılında Yatırım faaliyetleri kapsamında **200** adet kuş yuvası asılmıştır.

Cari faaliyetler kapsamında **740** ha. alanda biyolojik mücadele yapılarak **11.151** TL harcanmıştır. **234** ha biyoteknik mücadele yapılmış, **4.200** TL harcanmıştır. **192** ha alanda mekanik mücadele yapılarak **3.000** TL harcanmıştır.




SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİ

Mayıs ayı sonu itibariyle **139,5** ha. Doğal Gençleştirme, **44,7** Ha. alanda Yapay Gençleştirme, **1.030** ha. alanda Sıklık Bakımı, **30** Ha. budama çalışması gerçekleştirilmiştir.




İZİN VE İRTİFAK FAALİYETLERİ

2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar, **26** adet çeşitli kurum, kuruluş ve şahıslara 16, 17 ve 18. Madde izninden **47,4** Ha. Ormanlık alanda izin ve irtifak hakkı verilmiştir.

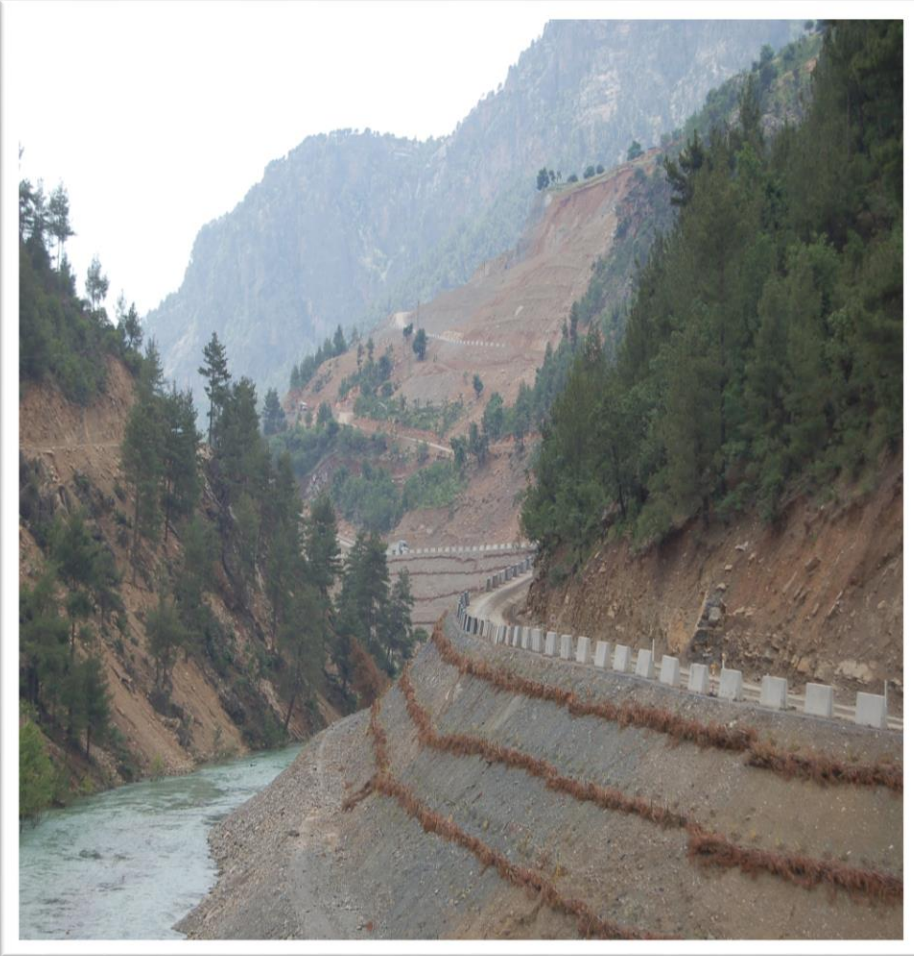

BAL ORMANI,ŞEHİR ORMANI VE MESİRE YERLERİMİZ

2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle Şehir Ormanımız **1** adet, Bal Ormanımız **3** adet ve Mesire Yeri sayımız ise **7** adettir.

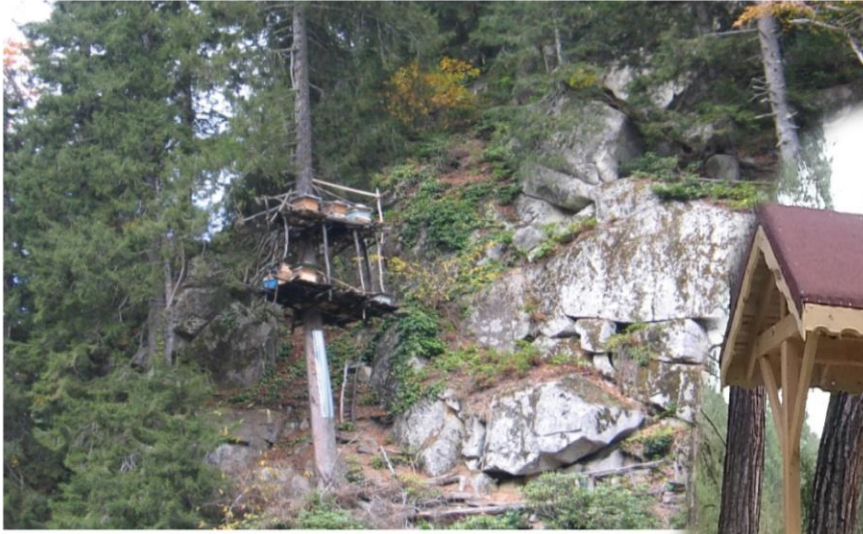


FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ FAALİYETLERİ

2017 yılında çeşitli türlerde **1.000.000** Adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir.



ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI

İlimizde 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar **369.245** adet fidan ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

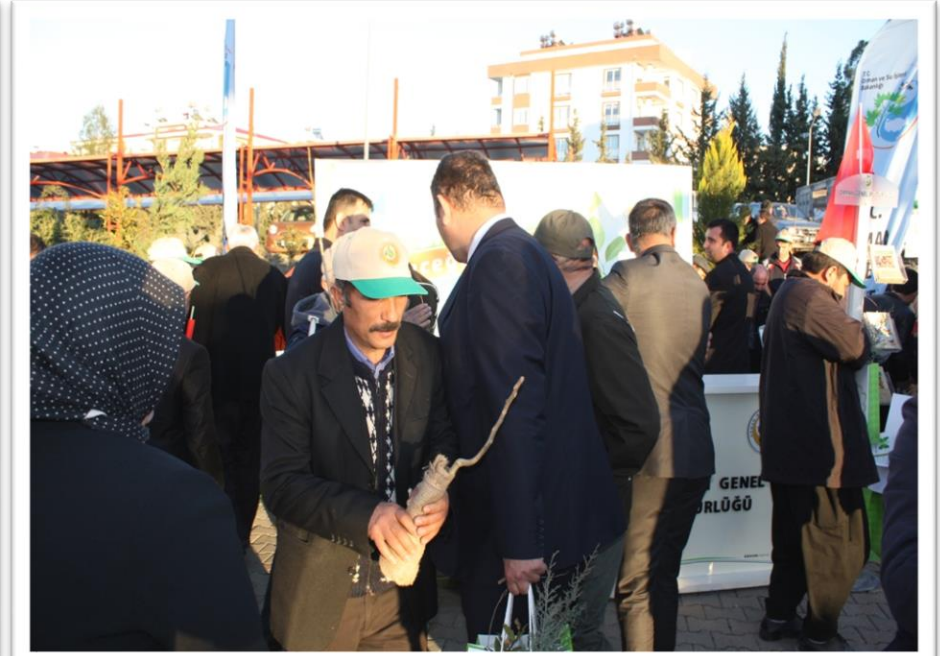

GELİR GETİRİCİ TÜRLERDE EYLEM PLANINA GÖRE

2015-2019 yılları arasında gelir getirici türlerle ağaçlandırma eylem planı ile Beşbin Köye Beşbin Orman eylem planı kapsamında **102,5** Ha. alana Dut, Ceviz, Badem ve diğer türlerinden **46.300** adet fidan dikilmesi planlanmıştır. Yapılan çalışmalarla birlikte **102,5** Ha. Sahada **59.692** adet çeşitli türde gelir getirici fidan dikilmiştir.



Ork y Kredilerinde Hedefler Erken GerekleŖti

(OGM) tarafından k yl lerin yaŖam standartlarını y kseltmeyi amalayan destek projesi kapsamında her yıl verilen Ork y kredileri bu yıl aylar  ncesinden t kendi. Haziran ayı itibariyle %90'ını daėıtılan kredilerin %20'sinin hibe olması, faiz uygulanmaması, geri  deme kolaylıėı saėlanması ve erken iŖbaŖı eėitimleriyle k yl lerin daha iyi bilinlendirilmesi gibi fakt rlerin talebi artırdıėı tespit edildi





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ

TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU: TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA

PROJE SAYISI	10	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	126.926.831	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	46.908.046
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	---
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	---
	2017 YILI ÖZKAYNAK	---
	2017 YILI HİBE	---
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	46.908.046	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	107.950.593	
2017 YIL İÇİ HARCAMA	7.691.590	
TOPLAM HARCAMA	115.642.183	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	17	

KURUMU: TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI	3
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	6
BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI	0
TAMAMLANAN PROJE SAYISI	1
TOPLAM	10



KURUMU: TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
1	Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale sinyalizasyon, telekomünikasyon tesisi yapımı ve altyapı iyileştirilmesi	Toprakkale	12.301.141	684.093	13.857.721	0	97	0
2	Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale elektrifikasyon tesisleri yapımı	Toprakkale	5.449.932	1.173.953	6.974.488	300.721	80	25
3	Toprakkale-Bahçe İstasyonları arası çift hatlı demiryolu etüd, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri	Toprakkale Merkez Bahçe	1.064.020	500.000	1.568.109	500	100	100



KURUMU: TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
4	Toprakkale-Bahçe yeni demiryolunun tünel imalatlarının yapımı	Toprakkale Merkez Bahçe	0	5.200.000	0	0	0	0
5	Toprakkale-Bahçe Altyapı tesislerinin yapımı	Toprakkale Merkez Bahçe	0	500.000	0	0	0	0
6	Toprakkale-Bahçe Üstyapı ve Elektrifikasyon tesisleri yapım	Toprakkale Merkez Bahçe	0	100.000	0	0	0	0
7	Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon tesisleri yapımı	Toprakkale Merkez Bahçe	0	500.000	0	0	0	0

KURUMU: TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ADANA


SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
8	Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Elektrifikasyon Projesi kapsamında yapılacak olan trafo merkezlerine enerji nakil hattı çekilmesi, proje ve yapım işi	Toprakkale Merkez Bahçe	0	250.000	0	0	0	0
9	Kadirli OSB Toprakkale Bağlantısı Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşİ	Toprakkale Merkez Kadirli	0	500.000	0	0	0	0
10	Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) varyantı altyapı ve üstyapı işleri	Bahçe	89135.500	33.000.000	104.526.512	7.390.369	53	22
TOPLAM			107.950.593	46.908.046	126.926.831	7.691.590	33	17



BOĞAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA-YENİCE, MERSİN-YENİCE-ADANA-TOPRAKKALE SİNYALİZASYON, TELEKOMÜNİKASYON TESİSİ YAPIMI VE ALTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ



KAYSERİ-BOĞAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA-YENİCE, MERSİN-YENİCE-ADANA-TOPRAKKALE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ YAPIMI

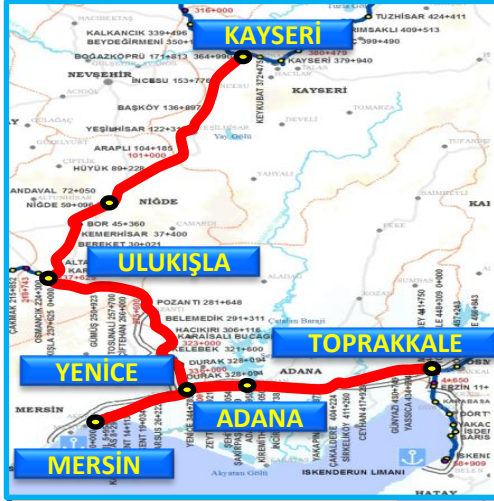

TOPRAKKALE-BAHÇE İSTASYONLARI ARASI ÇİFT HATLI DEMİRYOLU ETÜD, PROJE, MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ



- İHALE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR

- TOPRAKKALE BAHÇE YENİ DEMİRYOLU TÜNEL İMALATLARI YAPIM İŞLERİ

- TOPRAKKALE BAHÇE ALTYAPI TESİSLERİ YAPIM İŞLERİ

- TOPRAKKALE-BAHÇE ÜSTYAPI VE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ YAPIM


- TOPRAKKALE-BAHÇE-NURDAĞ-BAŞPINAR-GAZİANTEP-MUSTAFAYAVUZ
SİNYALİZASYON VE TELEKOMİNİKASYON TESİSLERİ YAPIMI

- TOPRAKKALE-BAHÇE-NURDAĞ-BAŞPINAR-GAZİANTEP-MUSTAFAYAVUZ
ELEKTRİFİKASYON PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN TRAFİKO MERKEZLERİNE
ENERJİ NAKİL HATTI ÇEKİLMESİ, PROJE VE YAPIM İŞİ

- KADİRLİ OSB TOPRAKKALE BAĞLANTISI ETÜT, PROJE, MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK
HİZMET ALIMI İŞİ




BAHÇE-NURDAĞ (FEVZİPAŞA) VARYANTI ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİ

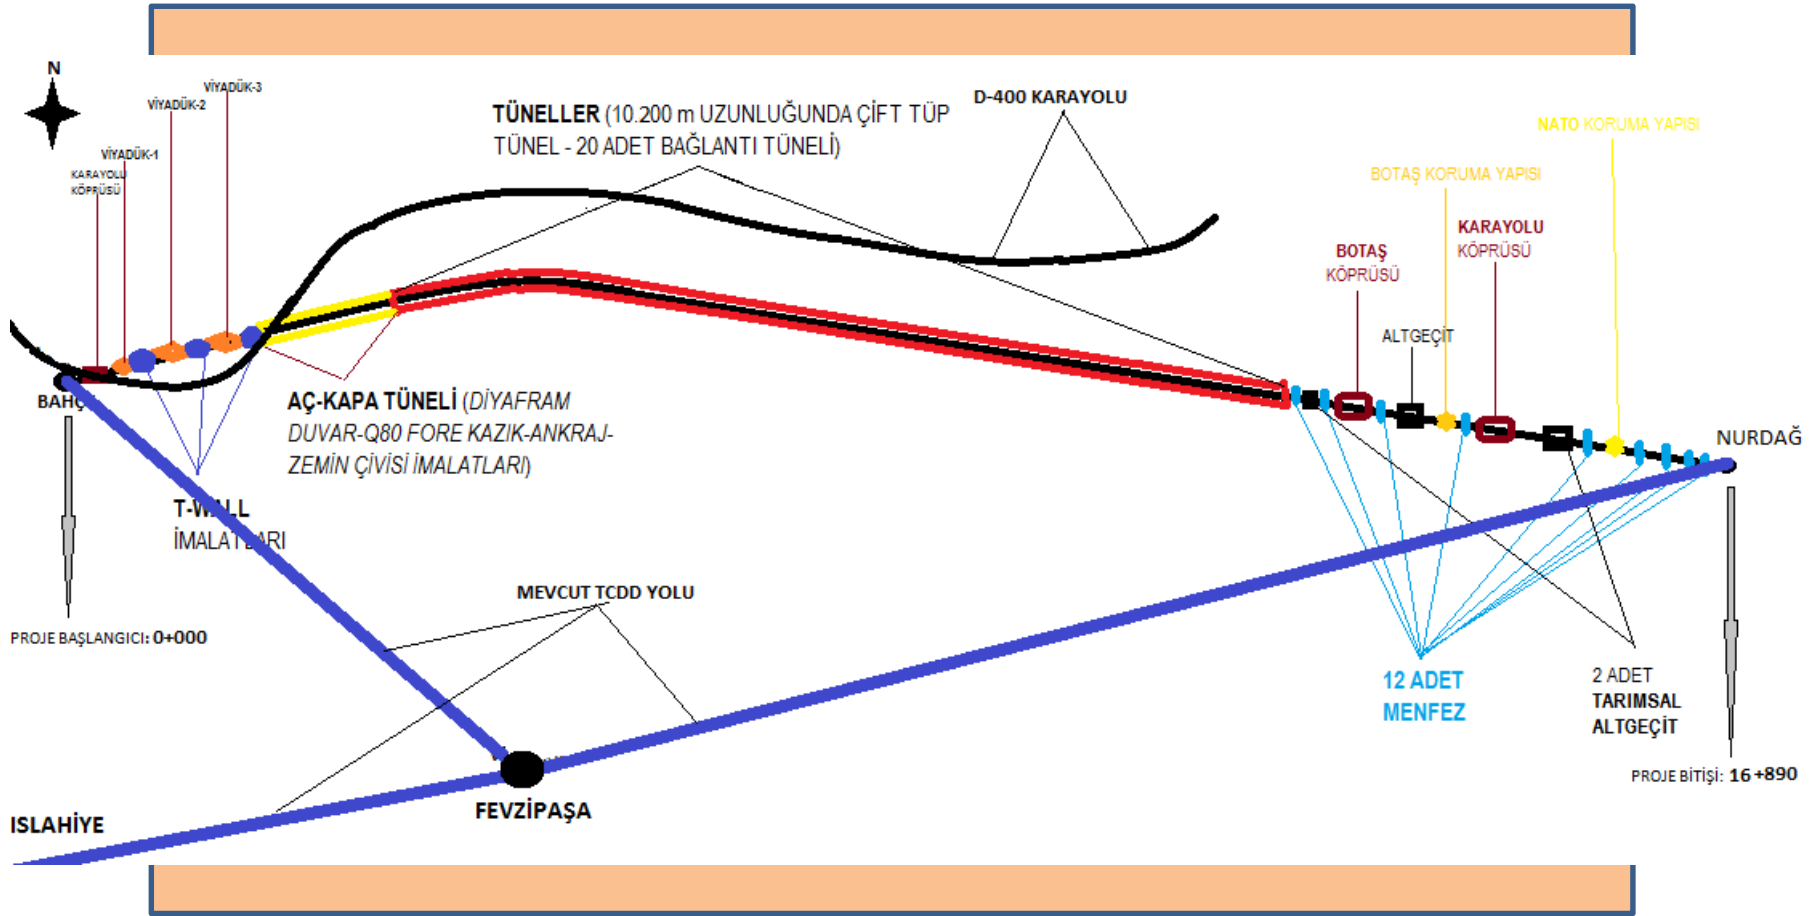

BAHÇE-NURDAĞ (FEVZİPAŞA) VARYANTI ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİ





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ

TEİAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU: TEİAŞ / 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI		3 (Üç)
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)		20.000.000
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	2.952.000
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	
	2017 YILI ÖZKAYNAK	
	2017 YILI HİBE	
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI		2.952.000
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI		34.000
2017 YIL İÇİ HARCAMA		472.954
TOPLAM HARCAMA		506.955
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		16

KURUMU:TEİAŞ / 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU****DEVAM EDEN PROJE SAYISI****1(Bir)****İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI****1(Bir)****BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI****1(Bir)****TAMAMLANAN PROJE SAYISI****-****TOPLAM****3 (Üç)**

KURUMU:TEİAŞ / 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	NAKDİ GERÇ. (%)
1	Osmaniye TM Yenileme (Farklı Sahada)	Merkez	2.000	1.950.000	8.000.000	2.000		
2	Bahçe-Osmaniye 2 EİH Yenileme	Osmaniye (Merkez Bahçe)	30.000	2.000	8.500.000	30.000		
3	Berke TM Tevsiat	Bahçe	2.000	1.000.000	3.500.000	474.955	5	47
	TOPLAM		34.000	2.952.000	20.000.000	506.955	5	16

1-) OSMANİYE-2 TM OSMANİYE TM YENİLEME

Proje No	: 10D030640
İşin Başlama-Bitiş Tar.	: 2010-2018
Karakteristiği	: 154/33 kV, 2X50 MVA Trafo
Proje Toplamı	: 8.000.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 2.000 TL
2017 Yılı Ödeneği	: 1.950.000 TL

Son Durumu: 19.06.2017 Tarihinde ihalesi yapılmış olup ihale değerlendirme çalışmaları devam ediyor.



2-) 154 kV BAHÇE-OSMANİYE 2 EİH YENİLEME

Proje No	: 12D030810
İşin Başlama -Bitiş Tarihi	: 2012–2018
Karakteristiği	: 154 kV, 2x1272 MCM 9,3 km (Yenileme) + 2x1272 MCM, 23,7 km (Yeni Hat) + 1272 MCM, 5,2 km (Yeni Hat)
Proje Toplamı	: 8.500.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 30.000 TL
2017 Yılı Ödeneği	: 2.000 TL



3-) Berke TM Tevsiat

Ref No	
Proje No	: 14D030990
İşin Başlama-Bitiş Tarihi	: 2014-2018
Yüklenici	: Mehmet Latif Altun
Karakteristiği	: 154 kV, 1 Fider (2. Trafo) ve OG şalt
İhale Tarihi	:15.11.2016
İhale Bedeli	: 1.534.838
Proje Bedeli	: 3.500.000 TL
Sözleşme Tarihi	: 12.12.2016
Yer Teslimi Tarihi	22.12.2016
İşin Süresi	360 Gün (16.12.2017)
Önceki Yıllar Harcaması	: 2.000 TL
2017 Yılı Ödeneği	: 502.000 TL
Nakdi Harcama	: 472.954 TL
Fiziki Gerçekleşme	: % 5



İnşaat : Ek binanın temel çalışmalarına başlandı. Şalt binası ve trafo temeli inşaatı devam ediyor.
Elektrik : Malzeme onayları ve testleri devam ediyor. Testleri tamamlanan malzemelerin sahaya sevkiyatı devam ediyor.



T.C.
OSMANİYE VALİLİĐİ

HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ



KURUMU: ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI	2	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	3.166.291	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	0
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	0
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	0
	2017 YILI ÖZKAYNAK	2.014.064
	2017 YILI HİBE	0
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	2.014.064	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	1.152.227	
2017 YIL İÇİ HARCAMA	341.447	
TOPLAM HARCAMA	1.493.674	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	47	

KURUMU: ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

2

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

0

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

0

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

0

TOPLAM

2



KURUMU: ADANA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIR A NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
1	Ala camii Restorasyonu	Kadirli	1.152.227	2.004.314	3.156.541	341.447	70	47
2	İlbistanlı köyü Hasan Dede Türbesi Proje Temini İşi.	Kadirli	0	9.750	9.750	0	95	0
			1.152.227	2.014.064	3.166.291	341.447		



OSMANİYE – KADIRLI ALA CAMİİ RESTORASYONU

OSMANİYE İLİ KADIRLI İLÇESİNDE BULUNAN ALA CAMİNİN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA CAMİİ ÇEVRESİNDEKİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMİNDE YAPILAN KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR. BUNA UYGUN GÜNCEL RÖLÖVE KURULA SUNULMUŞ OLUP, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.



OSMANIYE – KADIRLI ALA CAMİİ RESTORASYONU



OSMANIYE – KADIRLI ALA CAMİİ RESTORASYONU



OSMANIYE – KADIRLI ALA CAMİİ RESTORASYONU



OSMANIYE – KADIRLI ALA CAMİİ RESTORASYONU



OSMANIYE – KADIRLI İLBİSTANLI KÖYÜ HASAN DEDE TÜRBESİ PROJE TEMİNİ İŞİ.

OSMANIYE İLİ, KADIRLI İLÇESİNE BAĞLI İLBİSTANLI KÖYÜNDE BULUNAN VAKIF KÜLTÜR VARLIĞI HASAN DEDE TÜRBESİNİN RESTORASYONUNA ESAS UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİNİN İHALESİ YAPILARAK, YÜKLENİCİ FİRMAYA YER TESLİMİ YAPILMIŞTIR.

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON, ELEKTİRİK VE MEKANİK PROJELERİ HAZIRLANARAK İDAREMİZE TESLİM EDİLMİŞTİR. PROJELER ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ONAYINA GÖNDERİLMİŞTİR.



OSMANIYE – KADIRLI İLBİSTANLI KÖYÜ HASAN DEDE TÜRBEİ PROJE TEMİNİ İŞİ.



***Birden fazla yatırımı olup görsel eklemek isteyen kurumlar yeni sayfa ekleyerek görsellerini arttıracaklardır.



OSMANIYE – KADIRLI İLBİSTANLI KÖYÜ HASAN DEDE TÜRBEİ PROJE TEMİNİ İŞİ.



***Birden fazla yatırımı olup görsel eklemek isteyen kurumlar yeni sayfa ekleyerek görsellerini arttıracaklardır.



T.C.
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı



T.C. OSMANIYE VALİLİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU: ORMAN VE SU İŐLERİ OSMANİYE ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

PROJE SAYISI	1	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	250.000,00	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	250.000,00
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	0
	2017 YILI DIŐ KREDİ TUTARI	0
	2017 YILI ÖZKAYNAK	0
	2017 YILI HİBE	0
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	250.000,00	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	0	
2017 YIL İÇİ HARCAMA	0	
TOPLAM HARCAMA	0	
NAKDİ GERÇEKLEŐME ORANI (%)	0	



KURUMU: ORMAN VE SU İŐLERİ OSMANİYE ŐUBE MÜDÜRLÜĐÜ

PROJE GERÇEKLEŐME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI	0
İHALE AŐAMASINDAKİ PROJE SAYISI	1
BAŐLANAMAYAN PROJE SAYISI	0
TAMAMLANAN PROJE SAYISI	0
TOPLAM	1



KURUMU:ORMAN VE SU İŞLERİ OSMANİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
1	Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) Seyir Kulesi ve Giriş Takı (Tak+Wc+Depo+Giriş Kontrol Kulübesi) yapımı	Merkez		250.000.00	250.000.00	0	0	0



ZORKUN YAYLASI YABAN HAYATI GELİŐTİRME SAHASI

- 3.889,85 ha.
Büyükluęündeki Yaban Hayatı Geliőtirme Sahası, memeli hayvanlardan Karaca popülasyonunun arttırılması ve av turizmi kapsamında ava açılması amacıyla kurulmuştur.



ZORKUN YAYLASI YABAN HAYATI GELİŐTİRME SAHASI

- Yaban Hayatı Geliőtirme Sahasına, sahanın kaynak deęeri olan karaca ile dięer bitki ve hayvan t¼rlerinin sergileneceęi Ekosistem Bilgilendirme ve Tanıtım Kompleksi 2015 yılında yapılmıőtır. 2017 yılında seyir kulesi ve giriő takı (tak+wc+depo+giriő kontrol kul¼besi) yapılacaktır.



Ekosistem Bilgilendirme
ve Tanıtım Kompleksi

ZORKUN YAYLASI YABAN HAYATI GELİŐTİRME SAHASI

- 2016 yılında Ekosistem Bilgilendirme ve Tanıtım Kompleksi çevre düzenlemesi (İstinat duvarı, Taş duvar, Amfi tiyatro ve fosseptik) ve enerji nakil hattı yapılmıştır.



ZORKUN YAYLASI YABAN HAYATI GELİŐTİRME SAHASI

- 2016 yılı ierisinde Ekosistem Bilgilendirme ve Tanıtım Kompleksine mobilya ve mefruŐat alımı yapılmıŐtır.





ZORKUN YAYLASI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI

- Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme sahası Ekosistem Bilgilendirme ve tanıtım kompleksi Çevre Düzenleme çalışmaları kapsamında seyir kulesi ve giriş takı (tak+wc+depo+giriş kontrol kulübesi) yapımı planlanmış olup, işe ait ihale 30.06.2017 tarihinde yapılmıştır. Sözleşme öncesi yasal süreç devam etmektedir.



Peyzaj Projesi

FOTOKAPAN İLE YABAN HAYATI GÖZLEM VE TESPİT ÇALIŞMALARI

- İl Şube Müdürlüğümüzce il genelinde yapılan fotokapan ile yaban hayatı gözlem ve tespit çalışmaları neticesinde bugüne kadar, Yaban Keçisi, Kızıl Geyik, Karaca, Porsuk, Yaban Kedisi, Kurt, Tilki, Yaban Domuzu, Kuyruk süren, oklu kirpi, yaban tavşanı tespit edilmiştir.



Kurt



Kızıl Geyik



Yaban Keçisi

FOTOKAPAN İLE YABAN HAYATI GÖZLEM VE TESPİT ÇALIŞMALARI



Tilki



Karaca



Yaban Kedisi



Yaban Domuzu



Oklu kirpi



Kuyruksüren





Tapu ve Kadastro
XII. Bölge Müdürlüğü



T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ

TAPU VE KADASTRO XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



HATAY TAPU VE KADASTRO XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEMİ RAPORU

1- DÖNEMİ	: 2017 3. DÖNEM
2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : TAPU VE KADASTRO XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	
3- TOPLAM PROJE SAYISI	: 1
4- KADASTRO SEKTÖRÜ	: -
5- TOPLAM PROJE TUTARI	: 882.588,00 TL.
6- ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 96.626,20 TL
7- PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	: 785.961,80 TL.
8- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 186.397,00 TL
9- PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	: 32
10- FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: 32
11- BİTEN PROJE SAYISI	: --
12- DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 1
13- İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: --
14- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: --
15- BAŞLANAMAMA NEDENLERİ	: --
16- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	: --
17- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	: --
18-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	: --



İLİ :OSMANİYE

İLLER YATIRIM PROJELERİ



YILI : 2017

İZLEME RAPORU

YATIRIMCI DAİRE:TAPU VE KADASTRO 12.BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEMLER :

I.

II.

III.

IV.

SIRA NO	YATIRIMCI KURULUŞ	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (ilçesi)	İHALE TARİHİ	İŞİN BİTİM TARİHİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	PROJE BEDELİ (TL)	2017 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL)	2017 YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME (TL)	İŞİN BÜTÜNÜ FİZİKİ GERÇEKLEŞME (TL)	AÇIKLAMALAR
1	D.K.H	D.K.H (KADASTRO)	OSM-DZC 12-22	DÜZİÇİ	15.11.2016	09.03.2018	96,626.20 TL	785,961.80 TL	882,588.00 TL	186.397 TL	32	32	
2													
3													
4													
5													
TOPLAM							96,626.20 TL	785,961.80 TL	882,588.00 TL	186.397L	32	32	





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



KURUMU: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

PROJE SAYISI	8	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	162.240.000,00	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	24.000.000,00
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	0,00
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	0,00
	2017 YILI ÖZKAYNAK	0,00
	2017 YILI HİBE	0,00
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	24.000.000,00	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	143.578.378,74	
2017 YIL İÇİ HARCAMA	8.596.371,76	
TOPLAM HARCAMA	152.174.750,50	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	36	

KURUMU: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

7

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

1

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

-

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

-

TOPLAM

8



KURUMU: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
1	Çeşitli Ün. Etüd Projesi	Merkez	912.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
2	Kampus Altyapı	Merkez	7.697.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0	0
3	Derslik Merkezi Birimler	Merkez	100.299.000,00	15.000.000,00	131.500.000,00	7.878.187,92	60	50
4	Lojman ve Sos. Tesisler	Merkez	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0
5	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	Merkez	0,00	5.896.000,00	5.896.000,00	1.048.433,22	20	18



KURUMU: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
6	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Merkez	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0	0
7	Merkezi Araştırma Lab.	Merkez	11.642.000,00	1.000.000,00	12.642.000,00	0,00	0	0
8	Gayrimenkul Alımları ve kamulaştırma	Merkez	6.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9								
10								





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER ENSTİTÜLER BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER ENSTİTÜLER BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER ENSTİTÜLER BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER KADIRLI UYGULAMALI BİLİMLER YO BİNASI İNŞAATI





OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER KADIRLI UYGULAMALI BİLİMLER YO BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER KADIRLI UYGULAMALI BİLİMLER YO BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER BAHÇE MYO BİNASI İNŞAATI





OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER BAHCE MYO BİNASI İNSAATI





OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER BAHÇE MYO BİNASI İNŞAATI





T.C. OSMANİYE VALİLİĞİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ



KURUMU: OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

PROJE SAYISI	313	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	276.142.623	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	100.606.673
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	-
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	-
	2017 YILI ÖZKAYNAK	34.132.150
	2017 YILI HİBE	-
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	134.738.823	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	10.794.239	
2017 YIL İÇİ HARCAMA	32.917.144	
TOPLAM HARCAMA	43.711.383	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	27	



PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

31

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

3

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

129

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

150

TOPLAM

313



1- KÖY YOLLARI YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı : 220 Adet (585,55 Km)**
- **Proje Bedeli : 18.128.047,00.- TL**
- **Biten Proje Sayısı : 132 Adet (374,3 Km)**
- **Harcanan : 9.624.867,23 .- TL**
- **Devam Eden Proje Sayısı : 7 Adet(16,5 Km)**
- **Harcanan : 454.806,75 .-TL**
- **Başlanamayan Proje : 81 Adet**

1.1- ONARIM YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı** : **30 Adet (85 Km)**
- **Proje Bedeli** : **4.496.474,50.- TL**
- **Biten Proje Sayısı** : **18 Adet (58,5 Km)**
- **Harcanan** : **3.094.632,45 .- TL**
- **Devam Eden Proje Sayısı** : **3 Adet (5,5 Km)**
- **Harcanan** : **290.948,35 .- TL**
- **Başlanamayan Proje** : **9 Adet**

1.2- STABİLİZE YATIRIMLARI

- **2016 Yılı Toplam Proje Sayısı** : **105 Adet (295,3 Km)**
- **Proje Bedeli** : **3.364.411,96.- TL**
- **Biten Proje Sayısı** : **80 Adet (249,8 Km)**
- **Harcanan** : **2.846.021,36.- TL**
- **Devam Eden Proje Sayısı** : **3 Adet (8 Km)**
- **Harcanan** : **91.145,60 .-TL**
- **Başlanamayan Proje** : **22 Adet**



1.3- 1.KAT ASFALT KAPLAMA YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı** : **47 Adet (93,25 Km)**
- **Proje Bedeli** : **7.552.560,88.- TL**
- **Biten Proje Sayısı** : **23 Adet (36,8 Km)**
- **Harcanan** : **2.976.478,42.- TL**
- **Devam Eden Proje Sayısı** : **-----**
- **Harcanan** : **-----**
- **Başlanamayan Proje** : **24 Adet**

1.4- 2.KAT ASFALT KAPLAMA YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı : 38 Adet (112 Km)**
- **Proje Bedeli : 2.714.600,00.- TL**
- **Biten Proje Sayısı : 11 Adet (29,2 Km)**
- **Harcanan : 707.735,00.- TL**
- **Devam Eden Proje Sayısı : 1 Adet (3 Km)**
- **Harcanan : 72.712,50.- TL**
- **Başlanamayan Proje : 26 Adet**

DÜZİÇİ-ALİBOZLU 2. KAT ASFALT



KADIRLI-AZAPLI 1. KAT ASFALT



MERKEZ-KAZMACA-NERGİZLİ 2. KAT ASFALT



MERKEZ-ÇARDAK-GÖKBEKİRLER 1. KAT ASFALT



DÜZİÇİ- ALİKAHYALAR-BOŞNAK 1. KAT ASFALT



2- İÇME SUYU – TARIM- KANALİZASYON YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı : 55 Adet**
- **Program Yılı Ödeneği : 5.550.000.- TL**
- **Biten Proje Sayısı : 18 Adet**
- **Harcanan : 1.772.226.- TL**
- **Devam Eden Proje Sayısı : 9 Adet**
- **Harcanan : 3.209.065.- TL**
- **Başlanamayan Proje : 27 Adet**
- **İhale Aşamasındaki Proje : 1 Adet**

2.1- İÇME SUYU YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı : 46 Adet**
- **Program Yılı Ödeneđi : 4.625.000.- TL**
- **Biten Proje Sayısı : 18 Adet**
- **Harcanan : 1.844.450.- TL**
- **Devam Eden Proje Sayısı : 9 Adet**
- **Harcanan : 770.702.-TL**
- **Başlanamayan Proje : 18 Adet**
- **İhale Aşamasındaki Proje : 1 Adet**



İÇME SUYU YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR			
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA	
1	Çona Köyü İçme Suyu İsale Hattı Tadilat Projesi ve Çürükarmut başlısı İçmesuyu İsale ve Şebeke Yapımı.	MERKEZ		4.625.000,00			0	BAŞLANMADI	
2	15 ad. Köye Klorklama Cihazı Takılması	"					0	Köydes kapsamında değerlendirilmiştir.	
3	10 ad. Köyün İçme Suyu Depolarına Seramik Sineklik ve Tel Örgü Yapımı.	"					0	Köydes kapsamında değerlendirilmiştir.	
4	Mamul Mal Alımı (İçme ve Sulama Suyu Borusu, Vana, Vantuz Maşon vs. ve Ek parçaların alımı)	"					0	BAŞLANMADI	
5	Gökçedam Köyü Terfi hattı borusu değişim işi.	"					0	BAŞLANMADI	
6	Issızca-Tehçi-Dervişiye-Alıçpınar İsalesi 50 m3 lük Tevzi Deposu Yapım İşi.	"					0	BAŞLANMADI	
7	Kayalı Köyü 30 m3'lük depo yapımı (2016)	"				49.353,62	49.353,62	100	BİTTİ
8	39. Mekanize Tuğ. Kom.lığı Terfilili İsale ve Hidroforlu İçmesuyu Şebeke Hattı Yenileme Yapım İşi (2016)	"				309.099,70	370.870,15	100	BİTTİ

İÇME SUYU YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA SI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA A (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
9	Burgaçlı köyü Payamlı mahallesi İçmesuyu isale, depo ve şebeke yapım işi	BAHÇE					0	BAŞLANMADI
10	3 Adet Köyün İçme Suyu Depolarına Seramik, Sineklik ve Tel Örgü Yapımı Yukarıkarderesi-Yenioba mah. (2 Adet), Nohut (2 Adet), Kızlaç (1 Adet)	"					0	BAŞLANMADI
11	3 Adet Köyün İçme Suyu kaptajlarının Bakım Onarım ve etrafına koruma teli çekilmesi işi;	"					0	BAŞLANMADI
12	Gökmustafalı köyü Kuyu Terfi Hattı (ENH) ve şebeke yapımı	"					0	BAŞLANMADI
13	Arıklıkış köyü Taşoluk Mahallesi Memba ve şebeke yapımı (Projesi 3 yıl önce yapıldı)	"					0	BAŞLANMADI
14	Kıraçlar Mah. İsale hattı ve depo yapımı (2016)	"			45.238,49	45.238,49	100	Bitti

İÇME SUYU YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
15	Gökmustafalı Köyü içmesuyu İsale ve Şebeke hattı yenileme projesi yapımı (2016)	BAHÇE			45.756,15	45.253,06	100	BİTTİ
16	Y.Kardederesi Köyü Altunlar Mah. 30 m3 Depo Yapım İşi (2016)	"			146.296,84	38.762,78	30	DEVAM EDİYOR
17	Bekdemir Köyü Kirazlı Mah. İsale Hattı Yapım İşi (2016)	"					30	DEVAM EDİYOR
18	Bekdemir Köyü Kirazlı Mah. Şebeke Hattı Yapım İşi(2016)	"					30	DEVAM EDİYOR



İÇME SUYU YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
19	Çotlu Köyüne 75 M3 İçme Suyu Deposu Yapımı (Kargir Depo Değişimi)	DÜZİÇİ					0	BAŞLANMADI
20	5 Adet Köyün İçme Suyu Depolarına Seramik, Sineklik ve Tel Örgü Yapımı (Akçakoyunlu(1 Adet), Alibozlu (2 Adet), Bayındırlı (1 Adet), Çamiçi (1 Adet), Söğütlügöl (2 Adet)	"					0	Köydes kapsamında değerlendirilmiştir.
21	8 Adet Köyün İçme Suyu Depolarına Klorlama Cihazı Takılması (Akçakoyunlu(1 Adet), Çamiçi (1 Adet), Çatak (1 Adet), Çerçioğlu (2 Adet), Karagedik (1 Adet), Yazlamazlı (1 Adet), Selverler (1 Adet)	"					0	BAŞLANMADI
22	Alibozlu Merkez Bağlısı 100 M3 İçme Suyu Deposu Yapımı ve ana isale hattı yenilemesi (Kargir Depo Değişimi)	"					0	BAŞLANMADI
23	Bayındırlı Merkez Mahallesi 50 M3 İçme Suyu Deposu Yapımı (Kargir Depo Değişimi)	"					0	BAŞLANMADI



İÇME SUYU YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
24	Karaguz köyü içmesuyu şebeke yenilemesi	DÜZİÇİ			63.399,04		0	DEVAM EDİYOR
25	Çatak Çamkonuşu bağlısı İsale-Şebeke-Depo yapımı	"			225.652,58		0	DEVAM EDİYOR
26	Akçakoyunlu Köyü Köy içi İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı Yenilenmesi.(2016)	"			141.627,36	141.208,89	100	BİTTİ
27	Selverler Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi. (2016)	"					100	BİTTİ
28	Karagedik Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi. (2016)	"					100	BİTTİ
29	Gökçayır Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi. (2016)						100	BİTTİ
30	Çitli Köyü Karese Mahallesi İçme Suyu İsale Depo ve Şebeke Yapımı. (2016)				140.167,83	139.619,43	100	BİTTİ
31	Gümüş Köyü Mezdağ Tozluyurt İçme Suyu Depo ve Şebeke Yapımı. (2016)						100	BİTTİ

İÇME SUYU YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
					TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
32	Kalecik Köyü İçme Suyu İsale Proje Hattı (2016)	HASANBEYLİ		602.256,61	602.256,61	100	BİTTİ
33	Karadelik Grubu 1. Kısım :(Yoğunluk köyü Kaş-Elmalı Kayseri-Çıtırıklı-Dikenli) İçmesuyu isale ve şebeke yapım işi. 2. Kısım: İmirhanlı, Karaçalı, Taraklı, Yanalak, Dikenli Şebeke Yapımı	KADIRLI		789.857,19	355.181,18	45	DEVAM EDİYOR
34	Karatepe köyü hasancık şebeke yapımı	"		176.597,62		1	DEVAM EDİYOR
35	Koçlu Grubu Yoğunluk köyü Adaca Mahallesi 30 m3 lük depo ve şebeke yapım işi	"				100	BİTTİ (Köydes kapsamında değerlendirilmiştir)
36	2 Adet Köyün İçme Suyu Depolarına Seramik, Sineklik ve Tel Örgü Yapım işi. Kösepınarı köyü 4 adet depo ile Kayasuyu-Yenigün Ana deposu(200'lük Depo)	"					BAŞLANMADI
37	Karadelik Grup Köyleri (Kaştan sonrası) İçme Suyu Yeni tesis Projesi. (2016)	"		355.783,33	300.365,58	70	DEVAM EDİYOR
38	Akarca Köyü Sarıbülbüller Mah. (2016)	"				100	BİTTİ
39	Dertliler Mahallesi Ortaburun İçme Suyu İsale Depo Projesi (2016)	"		147.176,03	159.098,94	100	BİTTİ
40	Göztaş Köyü Sardamışmanlı İsalar Mah. İçme Suyu İsale(2016)	"				100	BİTTİ

İÇME SUYU YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA ASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
41	Höyük köyü İçme Suyu Depolarına Seramik, Sineklik ve Tel Örgü Yapım işi	SUMBAS					0	Köydes kapsamında değerlendirilmiştir.
42	Gaffarlı köyü İçme Suyu Depolarına Seramik, Sineklik ve Tel Örgü Yapım işi	"					0	Köydes kapsamında değerlendirilmiştir.
43	Esenli Köyü Bağdaş Bağlısı Kırkpınar İçmesuyu Yapım İşisi(2016)	"			257.992,93	76.393,20	30	DEVAM EDİYOR
44	Sayhöyüğü İçme Suyu Şebeke Yapımı(2016)	TOPRAKKALE					100	BİTTİ
45	Aslanpınarı İçme Suyu Şebeke Yapımı(2016)	"			291.550,82	291.550,82	100	BİTTİ
46	Lalegölü İçme Suyu Şebeke Yapımı(2016)	"					100	BİTTİ

2.2- TARIM YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı : 8 Adet**
- **Proje Bedeli : 625.000,00-. TL**
- **Biten Proje Sayısı : --**
- **Harcanan : --**
- **Devam Eden Proje Sayısı : --**
- **Harcanan : --**
- **Başlanamayan Proje : 8 Adet**



TARIM YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA SI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA A (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
1	Şekerdere SST Trapez Kanal yapım işi.	MERKEZ						BAŞLANMADI
2	Kırıklı Köyü Tepe Mahallesi SST Borulu Sistem yapılması	MERKEZ						BAŞLANMADI
3	Yk. Arıcaklı köyü İbişler Mah. Sulama Tesisi Membası Kaptajı Yapımı	BAHÇE						BAŞLANMADI
4	Yk. Karderesi köyü Ayvalık mahallesi sulama havuzu yapım işi (150 ton)	BAHÇE						BAŞLANMADI
5	Kaman köyü sulama havuzu yapım işi (80 Ton)	BAHÇE						BAŞLANMADI
6	Bekdemir Merkez Çamalanı (Muduklar) bağlısı Kanderesi su kaynağı havuz yapımı (100 ton	BAHÇE						BAŞLANMADI
7	Gökçayır Köyüne 100 Tonluk Sulama Havuzu Yapımı	DÜZİÇİ						BAŞLANMADI
8	Gümüş Mezdağ Tozluyurt Takıoğlu Pınarı İsale ve Havuz ve Kapalı sistem şebeke S.S.T. Projesi yapım işi	DÜZİÇİ						BAŞLANMADI

2.3- KANALİZASYON YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı : 1 Adet**
- **Proje Bedeli : 300.000,00 - TL**
- **Biten Proje Sayısı : --**
- **Harcanan : --**
- **Devam Eden Proje Sayısı : --**
- **Harcanan : --**
- **Başlanamayan Proje : 1 Adet**

KANALİZASYON VE ARITMA TESİSİ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
1	Akçakoyunlu Köyü Kanalizasyon Biyolojik Arıtma Tesisi.	Düziçi		300.000				BAŞLANMADI





HASANBEYLİ-KALECİK KÖYÜ İSALE HATTI





MERKEZ-KAYALI KÖYÜ İÇME SUYU DEPOSU






BAHÇE-KIRAÇLAR MAH DEPO VE İSALE HATTI





DÜZİÇİ-GÖKÇAYIR KÖYÜ ŞEBEKE DEĞİŞİMİ





**DÜZİÇİ-ÇİTLİ KÖYÜ İSALE DEPO VE
ŞEBEKE YAPIMI**



3- İNŞAAT YATIRIMLARI

- **2017 Yılı Toplam Proje Sayısı : 38 Adet**
- **Proje Bedeli : 254.226.770 .- TL**
- **Biten Proje Sayısı : --**
- **Harcanan : --**
- **Devam Eden Proje Sayısı : 15 Adet**
- **Harcanan : 20.562.486 .-TL**
- **Başlanamayan Proje : 21 Adet**
- **İhale Aşamasındaki Proje : 2**



EĞİTİM YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
1	Merkez Ticaret Meslek Lisesi (24 Derslik)	MERKEZ	4.615.528,40	10.770.709,45	12.030.100,00	4.769.467,42	85	DEVAM EDİYOR
2	Merkez Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi (300 Öğr. Pansiyon)	MERKEZ	1.973.190,22	7.919.010,43	9.980.440,00	3.108.333,22	52	DEVAM EDİYOR
3	Toprakkale Halk Eğitim Merkezi (8 Derslik)	TOPRAKKALE	0,00	3.009.996,70	4.599.640,00	3.009.997,30	75	DEVAM EDİYOR
4	Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi (1 Atölye)	SUMBAS	0,00	989.798,90	3.148.240,00	576.494,42	22	DEVAM EDİYOR
5	Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi (1 Atölye)	HASANBEYLİ	0,00	986.666,00	3.124.640,00	556.303,31	22	DEVAM EDİYOR
6	Merkez Halk Eğitim Merkezi (12 Derslik)	MERKEZ	0,00	1.849.940,48	6.831.020,00	1.839.672,38	20	DEVAM EDİYOR
7	Bilim Sanat Merkezi (12 Derslik)	MERKEZ	0,00	2.192.812,48	4.260.980,00	927.383,42	22	DEVAM EDİYOR
8	İlbistanlı İlkokulu (12 Derslik)	Kadirli	0,00	7.000.000,00	5.521.220,00	0,00	5	DEVAM EDİYOR

EĞİTİM YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
9	Bahçe Ortaokulu (12 Derslik)	BAHÇE	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0	İHALE AŞAMASINDA
10	Toprakkale Atatürk Ortaokulu (12 Derslik)	TOPRAKKALE	0,00	6.200.000,00	5.487.000,00	0,00	10	DEVAM EDİYOR
11	Merkez Fidanlık Anaokulu (5 Derslik)	MERKEZ	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0	Proje Çalışmaları Devam Ediyor
12	Merkez Anaokulu (5 Derslikli)	MERKEZ	0,00	1.300.000,00	2.186.400,00	0,00	0	Proje Çalışmaları Devam Ediyor
13	Merkez Vatan Anaokulu (5 Derslik)	MERKEZ	0,00	1.500.000,00	2.186.400,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
14	Merkez Vatan İlkokulu (24 Derslik)	MERKEZ	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
15	Merkez Alibeyli Ortaokulu (24 Derslik)	MERKEZ	0,00	931.000,00	4.652.400,00	0,00	0	Proje Çalışmaları Devam Ediyor
16	Merkez Güneysu Ortaokulu (Ek Bina 24 Derslik)	MERKEZ	0,00	931.000,00	4.652.400,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
17	Merkez Karacaoğlan Ortaokulu (Ek Bina 18 Derslik)	MERKEZ	0,00	780.000,00	3.885.600,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor

EĞİTİM YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
18	Merkez Eyüp Sultan Ortaokulu (12 Derslik)	MERKEZ	0,00	1.438.000,00	7.185.600,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
19	Merkez Erdem Beyazıt İ.H.O. (24 Derslik)	MERKEZ	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	Projeler İdaremiz Teknik Personellerce Kontrol Edilmektedir.
20	Merkez Hacıosmanlı İ.H.O. (32 Derslik)	MERKEZ	0,00	2.270.000,00	11.348.800,00	0,00	0	İLANDA
21	Kadirli Cemalpaşa İlkokulu (24 Derslik)	KADIRLI	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
22	Kadirli Cengiz Topel Ortaokulu (24 Derslikli)	KADIRLI	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
23	Kadirli Mesleki ve Teknik Anadolu Lis. (24 Derslik+60 Yataklı Uyg.)	KADIRLI	0,00	795.000,00	14.500.000,00	0,00	0	Arsa Temin Çalışmaları Devam Ediyor
24	Düziçi Anaokulu (5 Derslikli)	DÜZİÇİ	0,00	1.300.000,00	2.186.400,00	0,00	0	Proje Çalışmaları Devam Ediyor
25	Düziçi Haruniye İlkokulu (24 Derslikli)	DÜZİÇİ	0,00	931.000,00	4.652.400,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
26	Düziçi Ellek İlkokulu (Ek Bina 12 Derslikli)	DÜZİÇİ	0,00	1.621.000,00	8.104.000,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor

EĞİTİM YATIRIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
27	Düziçi Böcekli Ortaokulu (8 Derslik)	DÜZİÇİ	0,00	1.116.000,00	5.579.200,00	0,00	0	Ek Yatırım Programıyla Yer Değişikliği Yapılacaktır.
28	Toprakkale Çamlıkevler Anaokulu (5 Derslik)	TOPRAKKALE	0,00	1.500.000,00	2.186.400,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
29	Toprakkale Çamlıkevler İlkokulu (24 Derslik)	TOPRAKKALE	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	Zemin Etüt Çalışmaları Devam Ediyor
30	Toprakkale Mesleki ve Tek. Lise (24 Derslik + 300 Öğr. Pans. + Y.Hane + S. Sal + 3 Atölye)	TOPRAKKALE	0,00	8.967.527,00	20.250.000,00	0,00	0	Proje Çalışmaları Devam Ediyor
31	Toprakkale İmam Hatip Lisesi (24 Derslik+200 Öğr. Pans.)	TOPRAKKALE	0,00	2.231.587,28	15.150.000,00	0,00	0	Proje Çalışmaları Devam Ediyor
32	Bahçe Halk Eğitim Merkezi (12 Derslikli)	BAHÇE	0,00	632.500,00	5.500.000,00	0,00	0	Tapu- Vaziyet- Zemin Etüt Çalışmaları Tamamlandı.



SAĞLIK, SOSYAL , KÜLTÜR, GÜVENLİK V.B YATIRIMLAR

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	AÇIKLAMA
33	Osmaniye Merkez Yağlı Tahumlar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Merkez	1.710.052,86	2.787.230,45	12.153.410,00	2.438.363,17	30	DEVAM EDİYOR
34	Osmaniye Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Kadirli	1.465.526,97	3.331.892,70	7.233.400,00	995.462,98	35	DEVAM EDİYOR
35	Hasanbeyli İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Hasanbeyli	419.060,43	2.128.032,05	4.147.700,00	0,00	10	DEVAM EDİYOR
36	Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Toprakkale	0,00	2.149.056,00	4.514.680,00	692.145,00	15	DEVAM EDİYOR
37	Düziçi İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi	Düziçi	0,00	3.797.092,48	7.198.000,00	1.201.038,13	25	DEVAM EDİYOR
38	Merkez Özden Huzurevi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi	Merkez	0,00	868.300,00	808.300,00	447.826,03	95	DEVAM EDİYOR
TOPLAM			10.693.358,88	100.120.152,40	254.226.770,00	20.562.486,78		





MERKEZ TOSÇELİK SOSYAL BİLİMLER YURDU
%52 DEVAM EDİYOR





MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ
(24 DERSLİK)
%85 DEVAM EDİYOR



TOPRAKKALE HALK EĞİTİM MERKEZİ
(8 Derslik)
%75 DEVAM EDİYOR

HASANBEYLİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
(1 ATÖLYE)
%22 DEVAM EDİYOR





SUMBAS ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
(1 ATÖLYE)
%22 DEVAM EDİYOR



**KADIRLI İLBİSTANLI İLKOKULU
(12 DERSLİK)
%5 DEVAM EDİYOR**



MERKEZ HALK EĞİTİM MERKEZİ
(12 DERSLİK)
%20 DEVAM EDİYOR



MERKEZ BİLİM SANAT MERKEZİ (12 DERSLİK)

%20 DEVAM EDİYOR



TOPRAKKALE ATATÜRK ORTAOKULU (12 DERSLİK)

%10 DEVAM EDİYOR





T.C. OSMANIYE VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü projelerinin ihale ve yapımı İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır.



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI	32	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	218.171.280,00	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	85.058.548,72
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	0,00
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	0,00
	2017 YILI ÖZKAYNAK	0,00
	2017 YILI HİBE	0,00
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	85.058.548,72	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	7.098.718,62	
2017 YIL İÇİ HARCAMA TUTARI	14.787.651,47	
TOPLAM HARCAMA	21.886.370,09	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	17	



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

9

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

1

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

22

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

0

TOPLAM

32



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
1	Ticaret Meslek Lisesi (24 Derslik)	Merkez	4.615.528,40	10.770.709,45	12.030.100,00	4.769.467,42	85	78
2	Tosçelik Sosyal Bil. Lisesi Pansiyonu (300 Öğrenci)	Merkez	1.973.190,22	7.919.010,43	9.980.440,00	3.108.333,22	52	51
3	Halk Eğitim Merkezi (8 Derslik)	Toprakkale	0,00	3.009.996,70	4.599.640,00	3.009.997,30	75	65
4	Atölye (Çok Programlı Anadolu Lisesi)	Sumbas	0,00	989.798,90	3.148.240,00	576.494,42	22	18
5	Atölye (Çok Programlı Anadolu Lisesi)	Hasanbeyli	0,00	986.666,00	3.124.640,00	556.303,31	22	18



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
6	Halk Eğitim Merkezi (12 Derslik)	Merkez	0,00	1.849.940,48	6.831.020,00	1.839.672,38	20	27
7	Bilim Sanat Merkezi (12 Derslik)	Merkez	0,00	2.192.812,48	4.260.980,00	927.383,42	22	22
8	İlbistanlı İlkokulu (12 Derslik)	Kadirli	0,00	7.000.000,00	5.521.220,00	0,00	5	0
9	Bahçe Ortaokulu (12 Derslik)	Bahçe	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0	0
10	Atatürk Ortaokulu (12 Ek Derslik)	Toprakkale	0,00	6.200.000,00	5.487.000,00	0,00	10	0



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
11	Merkez Fidanlık Anaokulu (5 Derslik)	Merkez	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0	0
12	Merkez Anaokulu (5 Derslik)	Merkez	0,00	1.300.000,00	2.186.400,00	0,00	0	0
13	Vatan Anaokulu (5 Derslik)	Merkez	0,00	1.500.000,00	2.186.400,00	0,00	0	0
14	Vatan İlkokulu (24 Derslik)	Merkez	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	0
15	Alibeyli Ortaokulu (24 Derslik)	Merkez	0,00	931.000,00	4.652.400,00	0,00	0	0



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
16	Güneysu Ortaokulu (24 Ek Derslik)	Merkez	0,00	931.000,00	4.652.400,00	0,00	0	0
17	Karacaoğlan Ortaokulu (18 Ek Derslik)	Merkez	0,00	780.000,00	3.885.600,00	0,00	0	0
18	Eyüp Sultan Ortaokulu (12 Derslik)	Merkez	0,00	1.438.000,00	7.185.600,00	0,00	0	0
19	Erdem Beyazıt İ.H.O. (24 Derslik)	Merkez	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	0
20	Hacıosmanlı İ.H.O. (32 Derslik)	Merkez	0,00	2.270.000,00	11.348.800,00	0,00	0	0



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
21	Cemalpaşa İlkokulu (24 Derslik)	Kadirli	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	0
22	Cengiz Topel Ortaokulu (24 Derslik)	Kadirli	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	0
23	Mes ve Tek And Lis. (24 Derslik+60 Yataklı Uyg. Oteli)	Kadirli	0,00	795.000,00	14.500.000,00	0,00	0	0
24	Düziçi Anaokulu (5 Derslik)	Düziçi	0,00	1.300.000,00	2.186.400,00	0,00	0	0
25	Haruniye İlkokulu (24 Derslik)	Düziçi	0,00	931.000,00	4.652.400,00	0,00	0	0



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
26	Ellek İlkokulu (12 Ek Derslik)	Düziçi	0,00	1.621.000,00	8.104.000,00	0,00	0	0
27	Böcekli Ortaokulu (8 Derslik)	Düziçi	0,00	1.116.000,00	5.579.200,00	0,00	0	0
28	Çamlıkevler Anaokulu (5 Derslik)	Toprakkale	0,00	1.500.000,00	2.186.400,00	0,00	0	0
29	Çamlıkevler İlkokulu (24 Derslik)	Toprakkale	0,00	1.939.000,00	9.694.400,00	0,00	0	0
30	Mes. Ve Tek. Lise (24 Derslik+300 Öğr. Pans.+Yemekh + Spor Sln+Atl.)	Toprakkale	0,00	8.967.527,00	20.250.000,00	0,00	0	0

KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
31	İmam Hatip Lisesi (24 Derslik + 200 Öğr. Pansiyon)	Toprakkale	0,00	2.231.587,28	15.150.000,00	0,00	0	0
32	Halk Eğitim Merkezi (12 Derslik)	Bahçe	0,00	632.500,00	5.500.000,00	0,00	0	0
33								
34								
35								



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI: Merkez Ticaret Meslek Lisesi (24 Derslik)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %85)**



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI: Merkez Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi (300 Öğr. Pansiyon)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %52)**



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI: Toprakkale Halk Eğitim Merkezi (8 Derslik)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %75)**



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI: Atölye (Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %22)**



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI: Atölye (Hasanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %22)**



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI: Merkez Halk Eğitim Merkezi (12 Derslik)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %20)**



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ADI: Merkez Bilim Sanat Merkezi (12 Derslik)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %22)**



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ADI: Kadirli İlbistanlı İlkokulu (12 Derslik)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %5)**



KURUMU: İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ADI: Toprakkale Atatürk Ortaokulu (12 Derslik)



Proje Durumu: **Devam Ediyor. (Fiziki Gerçekleşme : %10)**





T.C.
OSMANIYE VALİLİĞİ

OSMANIYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI	13	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	256.874.000,00 TL.	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2016 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	
	2016 YILI İÇ KREDİ TUTARI	
	2016 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	
	2016 YILI ÖZKAYNAK	
	2016 YILI HİBE	
2016 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI		
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI	0,00 TL.	
2016 YIL İÇİ HARCAMA	0,00 TL.	
TOPLAM HARCAMA	0,00 TL.	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	0	



KURUMU: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

0

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

0

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

13

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

0

TOPLAM

13



KURUMU: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
1	OSMANIYE 600 YATAKLI DEVLET HASTANESİ	MERKEZ			240.000.000,00	0,00	0	0,00
2	SAĞLIK KOMPLEKSİ İDARİ HİZMET BİNASI	MERKEZ			8.500.000,00	0,00	0	0,00
3	MERKEZ 17 NOLU SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ + 112 ASHİ	MERKEZ			1.500.000,00	0,00	0	0,00
4	KADIRLI SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ + 112 ASHİ	KADIRLI			3.500.000,00	0,00	0	0,00
5	GEBELİ 3 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ + 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU	MERKEZ			417.000,00	0,00	0	0,00



KURUMU: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
6	2 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ + 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU	BAHÇE			417.000,00	0,00	0	0,00
7	KIZILÖMERLİ SAĞLIK EVİ	SUMBAS			250.000,00	0,00	0	0,00
8	KARAGEDİK SAĞLIK EVİ	DÜZİÇİ			250.000,00	0,00	0	0,00
9	BAŞMAHALLE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU	MERKEZ			417.000,00	0,00	0	0,00
10	SÖĞÜTLÜDERE 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU	KADIRLI			417.000,00	0,00	0	0,00

KURUMU: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (TL.)
11	TUFANPAŞA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU	KADIRLI			417.000,00	0,00	0	0,00
12	DAĞISTAN (FATİH SULTAN MEHMET)112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU	TOPRAKKALE			417.000,00	0,00	0	0,00
13	ÇONA 2 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	MERKEZ			372.000,00	0,00	0	0,00





GÜçlü yarınlar için



T.C. OSMANIYE VALİLİĞİ

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU:GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI	4	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	15.528.000	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	8.555.000
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	-
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	-
	2017 YILI ÖZKAYNAK	-
	2017 YILI HİBE	-
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	6.778.000	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI		
2017 YIL İÇİ HARCAMA	654.056	
TOPLAM HARCAMA	654.056	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	10	

KURUMU:GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI	3
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	-
BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI	1
TAMAMLANAN PROJE SAYISI	-
TOPLAM	4



KURUMU:GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
						TOPLAM HARCAMA (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)	MADDİ GERÇ. (%)
1	Kadirli Ek Tribün Yapımı Tamamlanması ve Bocce Oyun Sahası	KADIRLI		2.530.000,00	3.578.000,00	250.465,00	15	10
2	YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU	KADIRLI		500.000	5.000.000	3.360.202,00	80	70
3	SPORCU FABRİKASI	MERKEZ		500.000	5.000.000	-	-	-
4	SUMBAS FUTBOL SAHASI	SUMBAS		1.750.000	1.950.000	-	15	-



KADIRLI EK TRİBÜN YAPIMI TAMAMLANMASI VE BOCCE OYUN SAHASI



KADIRLI EK TRİBÜN YAPIMI TAMAMLANMASI VE BOCCE OYUN SAHASI



KADIRLI YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU



Sumbas Sentetik Zeminli Futbol Sahası



Sumbas Sentetik Zeminli Futbol Sahası





T.C. OSMANIYE VALİLİĞİ

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU: OSMANİYE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI	11	
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)	437.367	
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	437.367
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	---
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	---
	2017 YILI ÖZKAYNAK	---
	2017 YILI HİBE	---
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI	437.367	
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI		
2017 YILI (Nisan-Mayıs-Haziran)HARCAMA	120.601	
TOPLAM HARCAMA	156.410	
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	%36	

KURUMU: OSMANİYE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

11

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

TOPLAM

11



KURUMU: OSMANİYE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
				TOPLAM HARCAMA	NAKİT HARC. (TL.)	FİZİKİ GERÇ. (%)
Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	Tüm İlçeler	70.988	70.988	26.149	26.149	50
Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele	Tüm İlçeler	145.981	145.981	21.925	21.925	50
Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	Tüm İlçeler	48.484	48.484	20.792	20.792	50
TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSTEM PROJESİ	Tüm İlçeler	31.635	31.635	11.363,2	11.363,2	30
KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ	Tüm İlçeler	84.994	84.994	29.119,52	29.119,52	30
SULARDA TARIMSAL FAAL.KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ	Tüm İlçeler	3.000	3.000	1.500	1.500	50
MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON PROJESİ	Tüm İlçeler	3.344	3.344	3.340	3.340	85
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM GELİŞTİRME PROJESİ	Tüm İlçeler	996	996	523	523	50
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ	Tüm İlçeler	3.000	3.000	2.959,6	2.959,6	80
ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI PROJESİ (ÇATAK)	Tüm İlçeler	7.597	7.597	7.597	7.597	100
ARAZİ TAPULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	Tüm İlçeler	37.348	37.348	31.141,6	31.141,6	50
TOPLAM		437.367	437.367	156.410	156.410	



T.C. OSMANIYE VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



KURUMU: OSMANİYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE SAYISI		4
PROJE BEDELLERİ TOPLAMI (TL)		15.150.000
PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI	2017 YILI MERKEZİ BÜTÇE TAHSİSİ	2.853.000
	2017 YILI İÇ KREDİ TUTARI	-
	2017 YILI DIŞ KREDİ TUTARI	-
	2017 YILI ÖZKAYNAK	-
	2017 YILI HİBE	-
2017 YILI FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI		-
ÖNCEKİ YILLAR TOPLAM HARCAMA TUTARI		-
2017 YILI HARCAMA		-
TOPLAM HARCAMA		-
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)		-



KURUMU: OSMANİYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE GERÇEKLEŞME DURUMU

DEVAM EDEN PROJE SAYISI

-

İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI

1

BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI

3

TAMAMLANAN PROJE SAYISI

-

TOPLAM

4



KURUMU: OSMANIYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMU	SEKTÖRÜ	PROJE ADI	YERİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA MASİ	ÖDENEK	PROJE BEDELİ	HARCAMA	AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	D.K.H.	Düziçi İlçe Gıda Tarım Müd.Hiz.Biri.Sitesi	Düziçi	0	33.000	2.733.000	0	İlgili kurum tarafından proje değişikliği yapılıyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	D.K.H.	İl Jandarma komu. Lojman Yapımı (80 daire) Etüd Proje Hazırlama	Merkez	0	10.000	10.000	0	Plankote çalışmaları tamamlandı.Tüm evraklar Bakanlığımıza gönderildi.Zemin etüd çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	D.K.H.	İşkur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	Merkez	0	2.000.000	4.000.000	0	Bakanlığımızdan herhangi bir talimat gelmedi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	D.K.H.	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	Merkez	0	850.000	8.407.000	0	23.06.2017 tarihine ihale edilecektir

